

Согласовано
зам. Г.И. Ивашкиной
ФУП "УП" «ГЭК СПб»

Промышленно-Учебный ЦТЭК СПб
Центральный Строительный Управление
СОГЛАСОВАНО
27.11.2020

Согласовано
Главный инженер
ФУП "УП" «ГЭК СПб»
И.А. Каврапов

Согласовано
Генеральный директор
ГБУ «Центральный район»

Согласовано
Административный
Приморского района

27.11.2020
7чВ > -5°C

ПРОГРАММА

Принято для работы по присоединению ЦО прямого и обратного трубопроводов временной теплосети ДУ 250, ДУ 200, ДУ 100 на участке от ТК-5 (суш.) до врезки у домов объекта «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37А Озера Долного, ограниченного пр. Богатырским, ул. Планирной, ул. Сигцовой, ул. Стародеревенской ул.»

Время производства работ - 8,00 до 22,30 от 02.12.2020 г. до 02.12.2020 г.

Количество элементов попадающих под отключение: 15

Отключающая арматура находится: УТЗУТ-5, 17 точек 21/3, 15 от 34/2

Дреннирующая арматура расположена: ТК-5 (суш.), ТК-4 (суш.)

С отключением ЦО жилых-12, нежилых -0, школы-1, детский сад-2

Сварочных работ - 4, сварщиков - 4.

Количество стыков ДУ 250 мм - 4 стыка, ДУ 200 - 8 стыков, ДУ 100 - 4 стыка

Ответственный исполнитель: ООО «Энергетическое Строительство»
Производитель работ с емкостью Дмитрий Сергеевич 8(911)59-25-82
Начальник СЗ РТС ФУП "ГЭК СПб" В.Э. Рунин тел. 8 (901) 307-02-80
Программа действительна в течение 1 месяца.

Утверждаю:

Подрядная организация


ООО «Энергетическое Строительство»

Рогожкин
В.С. Рогожкин

Согласовано:

Зам. Гл. инженера

ФТС ГУП «ТЭК СПб»



Согласовано:

Санкт-Петербургский Комитет по энергетике

Согласовано:

ГУЖА Приморского района

Согласовано:


Производственное

управление ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано:

Главный инженер

ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»



ПРОГРАММА

Производства работ по присоединению ЦО прямого и обратного трубопроводов временной теплосети Ду250, Ду 200, Ду100 на участке от ТК-5 (сущ.) до врезок у домов объекта: «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37А Озера Долгого, ограниченного пр. Богатырским, ул. Планерной, ул. Ситцевой, ул. Стародеревенской ул.»

Время производства работ : с 8:00 02.12.2020 г. до 23:30 02.12.2020 г.

Количество абонентов, подающих под отключение: 15

Отключающая арматура находится: УТ3, УТ-5. План 21/3, 150г. 34/2

Дренирующая арматура расположена: ТК-5 (сущ.), ТК4 (сущ.)

С отключением ЦО жилых-12 жилых -0, школа-1, детский сад-2

Сварочных постов – 4 ; сварщиков – 4.

Количество стыков: Ду 250 мм – 4 стыка, Ду 200 – 8 стыка; Ду 100 – 4 стыка;

Ответственный представитель ООО «Энергетическое Строительство»

Производитель работ Семеновков Дмитрий Сергеевич 8(911)159-25-82

Начальник СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» В.Э. Руппель тел. 8 (901) 307-02-80

Программа действительна в течении 1 месяца.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП "ТЭК СПб" с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с и получение подтверждения заявки.	29.11.2020	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
2	Отключение существующего прямого и обратного трубопроводов теплотрассы и опорожнение системы.	с 8:00 02.12.2020 г. До 11:00 02.12.2020 г.	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
3	Производство работ по присоединению временного прямого и обратного трубопроводов к существующей тепловой сети.	С 11:00 02.12.2020 г. до 21:00 02.12.2020 г.	ООО "Энергетическое Строительство»	Д.С Семенов
4	Оповещение АДС ЛРТС о завершении работ.	в 21:30 02.12.2020 г.	ООО "Энергетическое Строительство»	Д.С Семенов
5	Заполнение прямого и обратного трубопровода Ду 250; мм., Ду 200 мм., Ду 100 при получении положительных анализов СЭС.	с 21:30 02.12.2020 г. до 23:00 02.12.2020 г.	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
6	Постановка на циркуляцию в присутствии представителя ООО «Энергетическое Строительство» оповещение ЦДС о завершении работ.	с 23:30 02.12.2020 г.	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб" ООО "Энергетическое Строительство»	В.Э. Руппель Д.С Семенов

Список абонентов подающих пол отключение:

дома по Богатырскому пр. № 30/1, 30/2, 34/1, 34/2, 36/2, 36/1;




дома по Ситцевой ул. № 15, 17/2, 11/1;

дома по Стародеревенской ул. № 2, 32/1, 203

дома по Планерной ул. № 19/1, 21/1, 21/3

Трудовой Комитет Миссионерского П.К.

Виктор Васильевич
Трудовой Комитет Сурашова в.р.



Начальник СЗРТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

[Signature]
В.Э. Руппель

Начальник УСК ГУП "ТЭК СПб"

А.Г. Савинов

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"

Д.В. Мяконин

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

О.С. Белов

Начальник АД РТС ГУП «ТЭК СПб»


А.Т. Кильгишов

Ответственный за производство работ от ООО «Энергетическое Строительство»

[Signature]
ДС Семенов

СХЕМА переключения ЦО.

Прямого и обратного трубопровода временной тепловой сети на участке ТК-5 (сущ.) по объекту: "Реконструкция тепловых сетей в квартале 37А Озера Долгого, ограниченного Богатырским пр., Планерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул."

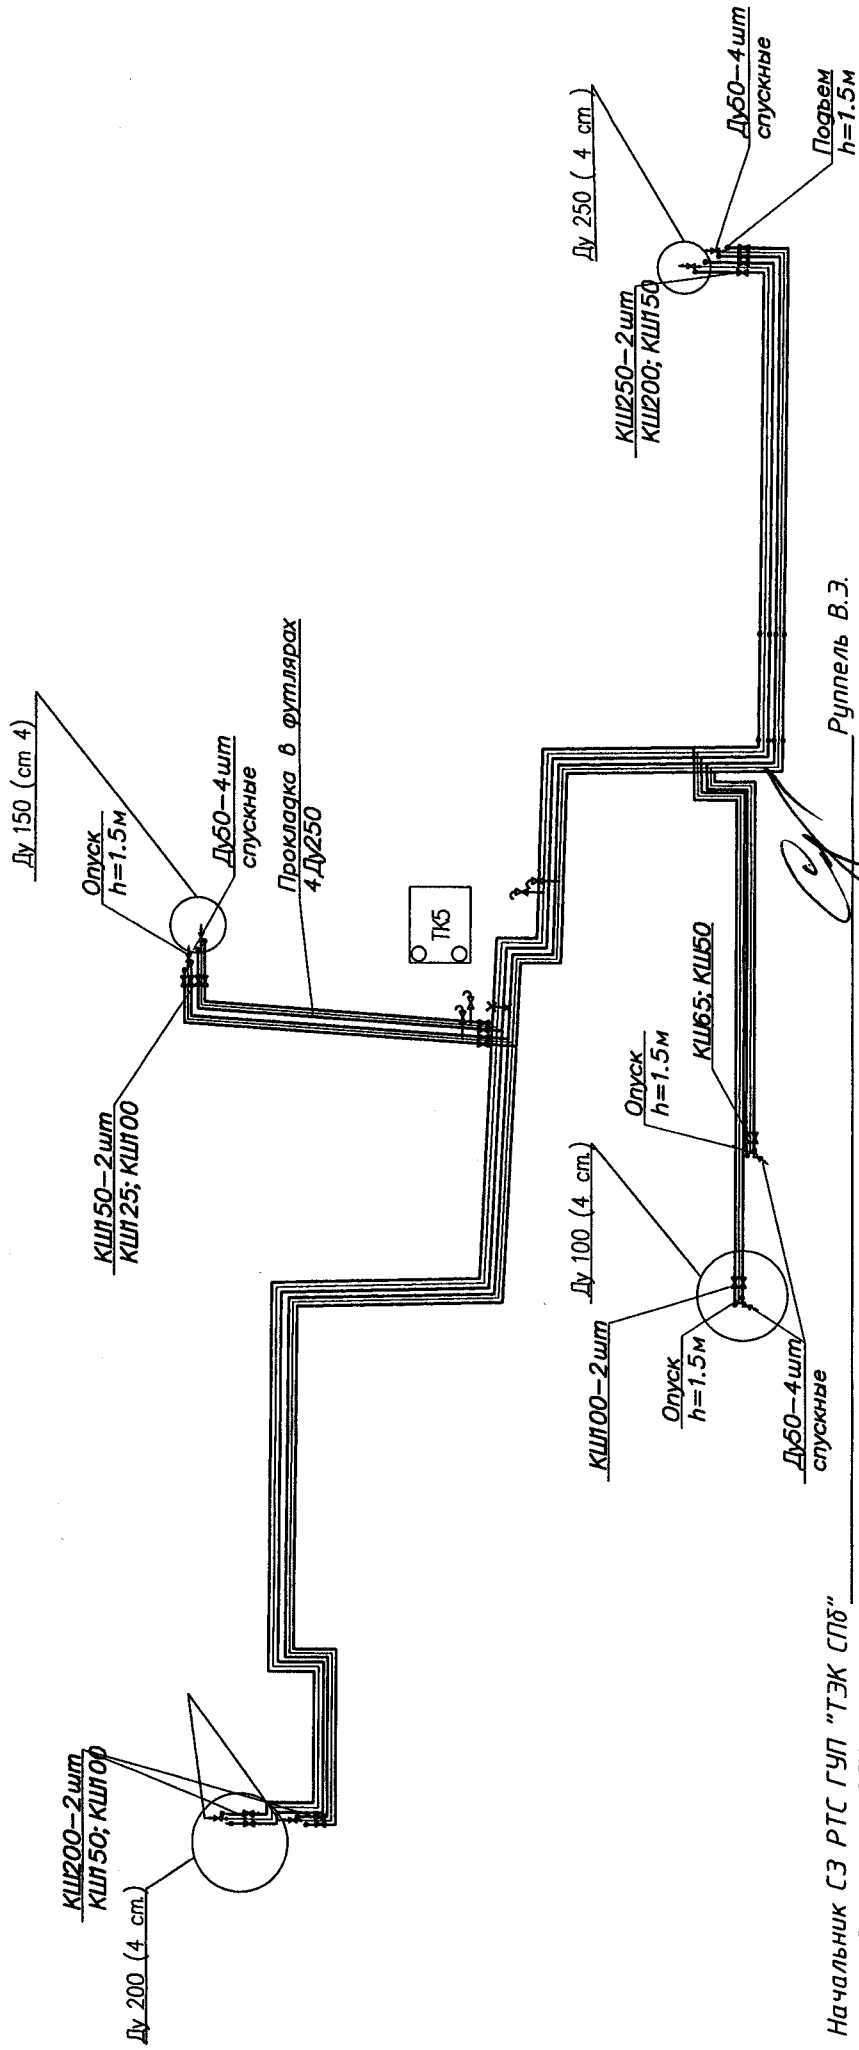

Начальник СЗ РТС ГУП "ТЭК СПб" _____
 Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб" _____
 Ответственный за производство работ _____
 ООО "Энергетическое Строительство" _____
 Руппель В.Э.
 Мяконин Д.В.
 Семенов Д.С.
