


Утверждено:
 Генеральный директор
 ООО «СМВ-СТРОЙ»

М. В. Ситников

Согласовано:

Заместитель главного инженера
 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»
 Фирма тепловых сетей
 192007, Санкт-Петербург,
 Днепропетровская ул., д. 69



Согласовано:
 Администрация Красносельского района
 И.О. Костюков

Согласовано:

ГУЖА Красносельского района
 Заместитель начальника

Согласовано: ГУП «ТЭК СПб»
 Заместитель начальника производственно-диспетчерского управления
 ПУ ГУП «ТЭК СПб» СОВАНУ
 «16» 04 2021 г.

ПРОГРАММА (РСПП)

производства работ по врезке вновь построенного (прямого и обратного) трубопровода Ду500мм, Ду150мм, Ду50мм на объекте:

«Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарьковского, Новобелецкой ул., в Красносельском районе, ФЗУ №6)»

Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 19

Дата и время производства работ: « 20 » 04.2021г. с 08:00 до 24:00

Дренирующая арматура:

Отключающая арматура расположена: в тепловых камерах К-14а и ТК-5

С отключением потребителей от ЦО, ГВС.

Количество абонентов, попадающих под отключение ЦО, ГВС: 30 шт., из них жилых зданий – 20 шт., административных зданий – 5 шт., школ и детских садов – 5 шт.; ул. Тамбасова д.2 к.1, к.2, к.3, к.4, д.4 к.1, к.2, д.5, д.6 к.1, к.2, д.8 к.1, к.2, к.3, к.4, д.9, д.10 к.1, д.12; ул. Здоровцева д.8 лит.А, д.10 к.1, д.12, д.14; ул. Чекистов д.26, д.28; пр-кт Ветеранов д.129 к.2, д.131, д.133 к.2, д.135 к.3, д.139 к.1, к.2; ул. Новобелецкая д.6 к.1, к.2.

Количество стыков: Ду 150мм – 1 шт, Ду50мм – 4 шт.


Количество заглушек: Ду500мм – 0 шт, Ду50мм – 0 шт.

Количество сварочных постов: 3 шт.

Ответственный за производство работ: Харитонов Кирилл Евгеньевич, тел. +7-909-577-91-59


Тамбасов
 3:7 (4) ПР

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	« 20 » 04.2021г. с 08:00 до 08:10	ООО «СМВ-СТРОЙ»	Харитонов К.Е.
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	« 20 » 04.2021г. с 08:10 до 08:20	Левобережный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «СМВ-СТРОЙ»

М.В.Ситников



Согласовано:

Администрация Красносельского района

Согласовано:
КЭИМО

Согласовано:


Заместитель главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано:


ГУЖА Красносельского района

Согласовано:

Заместитель начальника
ПУ ГУП «ТЭК СПб»



Филиал тепловых сетей
192007, Санкт-Петербург,
Амурсоветская ул., д. 69



ПРОГРАММА (РСПП)

производства работ по врезке вновь построенного (прямого и обратного) трубопровода Ду500мм, Ду150мм, Ду50мм на объекте:

«Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарьковаго, Новобелечкой ул., в Красносельском районе, ФЗУ №6)»

Источник теплоснабжения: 4-я Красносельская котельная, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстрога, д. 19

Дата и время производства работ: « 20 » 04.2021г. с 08:00 до 24:00

Дренажирующая арматура:

Отключающая арматура расположена: в тепловых камерах К-14а и ТК-5

С отключением потребителей от ЦО, ГВС.

Количество абонентов, попадающих под отключение ЦО, ГВС: 30 шт., из них жилых зданий – 20 шт., административных зданий – 5 шт., школ и детских садов – 5 шт.; ул. Тамбасова д.2 к.1, к.2, к.3, к.4, д.4 к.1, к.2, д.5, д.6 к.1, к.2, д.8 к.1, к.2, к.3, к.4, д.9, д.10 к.1, д.12; ул. Здороваца д.8 лит.А, д.10 к.1, д.12, д.14; ул. Чекистов д.26, д.28; пр-кт Ветеранов д.129 к.2, д.131, д.133 к.2, д.135 к.3, д.139 к.1, к.2; ул. Новобелечкая д.6 к.1, к.2.

Количество стыков: Ду150мм – 4 шт, Ду50мм – 4 шт.

Количество заглушек: Ду500мм – 0 шт, Ду50мм – 0 шт.

Количество сварочных постов: 3 шт.

Ответственный за производство работ: Харитонов Кирилл Евгеньевич, тел. +7-909-577-91-59

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	« 20 » 04.2021г. с 08:00 до 08:10	ООО «СМВ-СТРОЙ»	Харитонов К.Е.
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	« 20 » 04.2021г. с 08:10 до 08:20	Левобережный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.

3	Отключение и опорожнение существующего трубопровода	« 20 » 04.2021г. с 08:20 до 09:00	Левобережный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.
4	Производство работ по врезке вновь востроенного трубопровода Стыки: Ду500мм – 8 шт, Ду50мм – 4 шт. Заглушки: Ду500мм - 0 шт, Ду50мм – 0 шт. Сварочные посты: 2 шт.	« 20 » 04.2021г. с 09:00 до 23:20	ООО «СМВ-СТРОЙ»	Харитонов К.Е.
5	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ	« 20 » 04.2021г. с 23:20 до 23:30	ООО «СМВ-СТРОЙ»	Харитонов К.Е.
6	Заполнение <i>вновь востроенного</i> трубопровода. Подача ЦО, ГВС абонентам	« 20 » 04.2021г. с 23:30 до 24:00	Левобережный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Маслов В.Ю.

Приложение №1. Схема производства работ по врезке вновь построенного трубопровода тепловой сети Ду500мм, Ду150мм, Ду50мм.

Приложение №2. Подписи абонентов, попадающих под отключение ГВС, ЦО.

Начальник Левобережного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

/ В.Ю. Маслов

Начальник ОСКпорСО ДТП ГУП «ТЭК СПб»

/ Л.В. Хилько


Ведущий инженер ОСКпорСО ДТП ГУП «ТЭК СПб»

/ В.Р. Нелюбов

Представитель ООО «СМВ-СТРОЙ»

/ К.Е. Харитонов

Схема производства работ по врезке вновь построенного (прямого и обратного) трубопровода Ду500мм, Ду150мм, Ду50мм на объекте: «Строительство тепловой сети для подключения объекта по адресу: с.Санкт-Лембурз, ул. Тамбасова, участок 94 (территория, ограниченная ул. Тамбасова, пр. Ветеранов, ул. Пограничника Гарьковского, Новобелевской ул., в Красносельском районе, ФЗУ 6)»

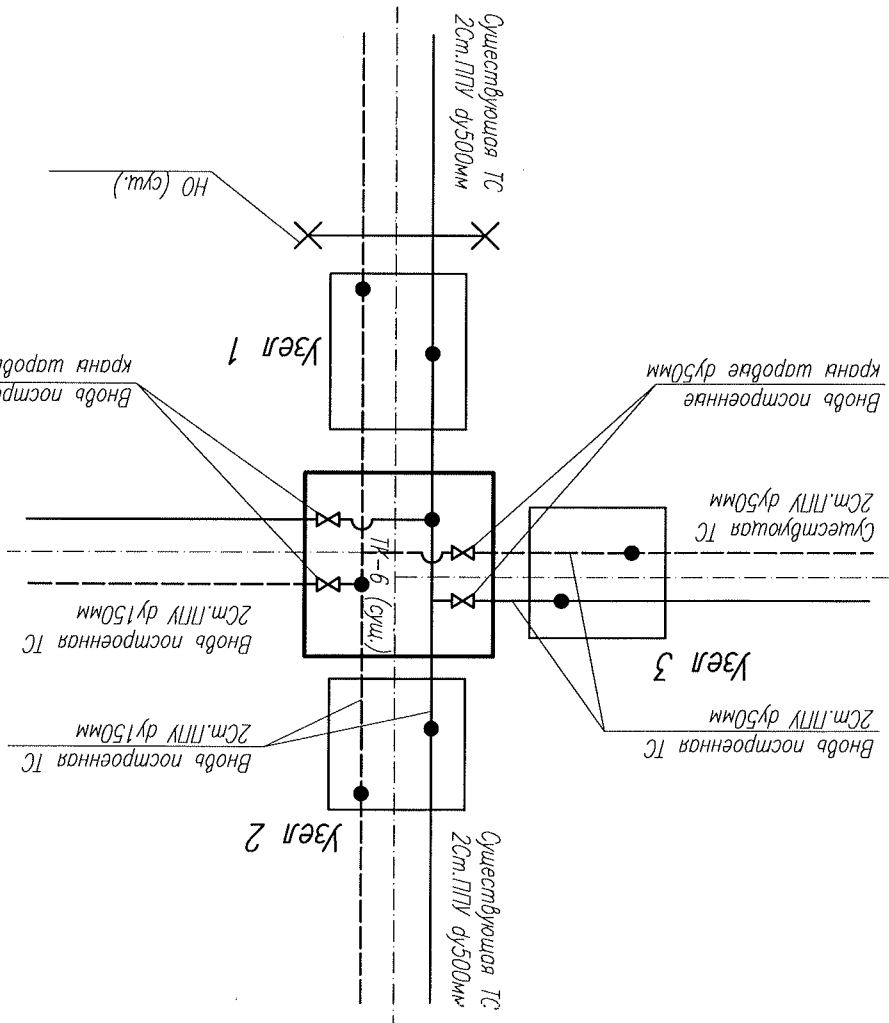

пр-кт Ветеранов

Начальник ЛБРС ФТС ГЛП "ЭК СПб" Маслов В.Ю.

Ведущий инженер ОСКОРСО ЛТП ГЛП "ЭК СПб" Немцов В.Р.

Начальник участка ООО "СМВ-СТРОЙ" Харитонон К.Е.
