

Утверждаю:
Подрядная организация
ООО «Энергетическое Строительство»

В.С. Рогожкин


Согласовано:
Зам. Гл. инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»



Согласовано:
Санкт-Петербургский Комитет по
энергетике

10.11.20

Согласовано:
ГЛА Приморского района



ПРОГРАММА

Производства работ по присоединению прямого и обратного трубопровода ГВС постоянной тепловой сети Ду125, Ду80, Ду65, Ду50 по врезке домов д. 24 к. 1, д. 18 Стародеревенской ул., объекта: «Реконструкция тепловых сетей в квартале 37А Озера Долгого, ограниченного пр. Богатырским, ул. Планерной, ул. Сигцевой, ул. Стародеревенской ул.»

Время производства работ : с 8:00 17.11.2020 г. до 23:30 17.11.2020 г.

Количество абонентов, попадающих под отключение: 3

Отключающая арматура находится: на ВТС у дома 18 Стародеревенской ул., 24 к 1 Стародеревенской ул.

Дренирующая арматура расположена: ИТП

С отключением ГВС

Сварочных постов – 7 ; сварщиков – 7

Количество стыков: Ду 125 – 4 стыка; Ду 80 – 4 стыка ; Ду 65 – 12 стыка ; Ду 50 – 12 стыков


Ответственный представитель ООО «Энергетическое Строительство»

Производитель работ Семенов Дмитрий Сергеевич 8(911)159-25-82

Начальник СЗ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» В.Э. Руппель тел. 8 (901) 307-02-80

Программа действительна в течении 1 месяца.

108768



Согласовано:
Главный инженер
ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»



№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП "ТЭК СПб" с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с и получение по дтвверждения заявки.	13.11.2020 г.	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
2	Отключение существующего прямого и обратного трубопроводов теплосети и опорожнение системы.	с 8:00 до 11:00 17.11.2020 г.	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
3	Производство работ по присоединению временного прямого и обратного трубопроводов к существующей тепловой сети.	с 11:00 до 21:00 17.11.2020 г.	ООО "Энергетическое Строительство"	Д.С Семенов
4	Оповещение АДС ЛРТС о завершении работ.	в 21:30 17.11.2020 г.	ООО "Энергетическое Строительство"	Д.С Семенов
5	Заполнение прямого и обратного трубопровода Ду125, Ду80, Ду65, Ду50, при получении положительных анализов СЭС.	с 21:30 до 23:00 17.11.2020 г.	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель
6	Постановка на циркуляцию в присутствии представителя ООО «Энергетическое Строительство» оповещение ЦДС о завершении работ.	с 23:30 17.11.2020 г.	СЗРТС ГУП "ТЭК СПб" ООО "Энергетическое Строительство"	В.Э. Руппель Д.С Семенов

Список абонентов подающих под отключение:

дома по Богатырскому пр. 28

дома по Стародеревенской ул. № 18, 24/1

Начальник СЗРТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Начальник УСК ГУП "ТЭК СПб"

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб

Начальник АДГ РТС ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за производство работ от ООО «Энергетическое Строительство»

В.Э. Руппель

С.Г. Савинов



Д.В. МЯКОНИН

О.С. Белов

А.Т. КИЛЬГИШОВ

Д.С. Семенов

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГВС
 прямо и обратного течения врезки вренной меловой сему от места врезки на участке от ТК-1 (суд/сп.
 проектирования) до врезки ЛТТ вл. Самаровской ул. 24 кв.2" по объекту: "Реконструкция мелиоративных сетей в квартале
 37А Озера Долгого, ограниченного Босатырским пр., Планерной ул., Самарской ул., Самаровской ул."

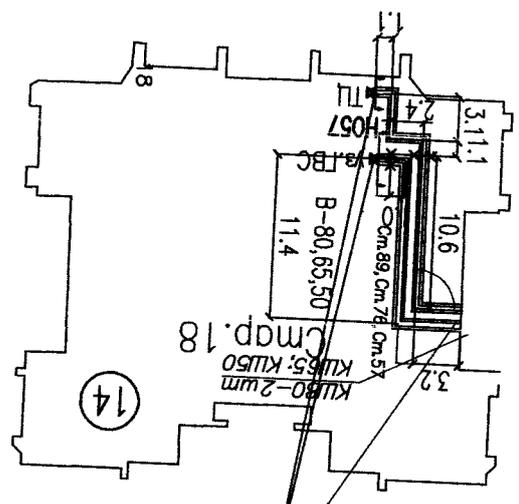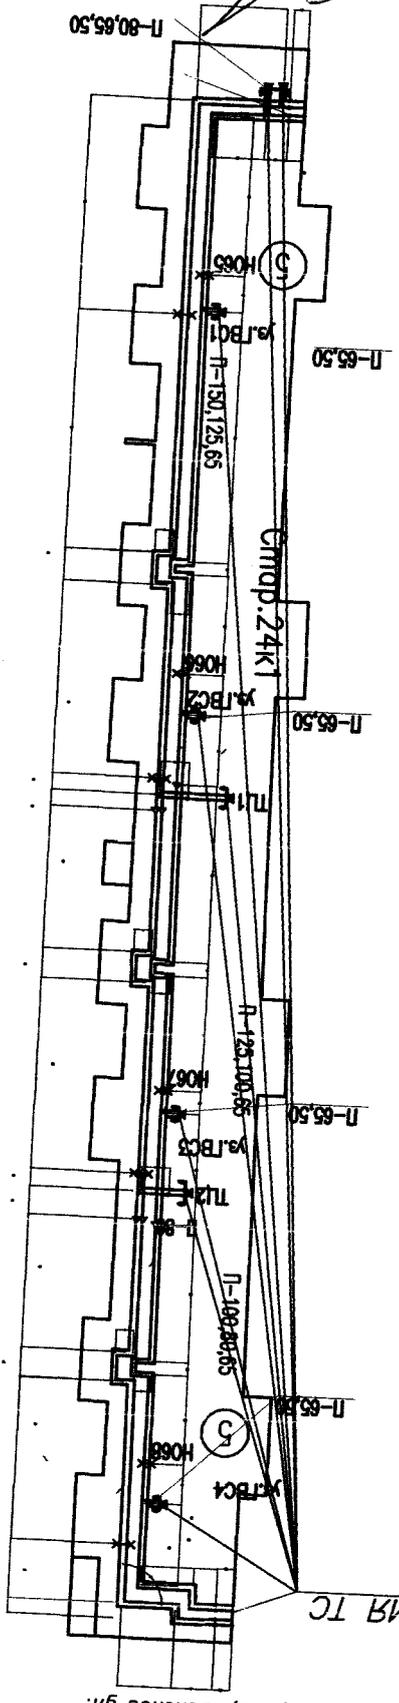

МЕСТО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТС

МЕСТО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТС

Начальник СЗ РТС ГЛП "ТЭК СПб"
 Ведущий инженер ОСК по ТС ГЛП "ТЭК СПб"
 ООО "Энергетическое предприятие"
 Ответственный за производство работ

Пуняев В.В.
 Миконин Д.В.
 Семьяков Д.С.
