

Согласовано:
 ООО «Инженерная Компания»
 ИП А.И. Федоров
 Компания

Согласовано:
 ГУЖ «ТЭК СПб»
 Филиал тепловых сетей
 2007, Санкт-Петербург
 Днепропетровская ул.,
 район Пушкинского
 района Санкт-Петербурга

Согласовано:
 Зам. Главного инженера
 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано:
 2007, Санкт-Петербург
 Днепропетровская ул.,

Согласовано:
 Комитет по энергетике
 и коммунальному хозяйству
 Санкт-Петербурга

Согласовано:
 для документов

Согласовано:
 Администрация Пушкинского района
 Санкт-Петербурга

Согласовано:

Согласовано: ГУП «ТЭК СПб»
 Производственное управление
 СОГЛАСОВАНО

ПРОГРАММА

«09» 04 21

Производство работ по переключению построенного прямого и обратного постоянного трубопровода тепловой сети 2Ду150, Ду65 и Ду50
 объекте: «Реконструкция тепловых сетей к зданию пансионата ветеранов РАН» на участке: от Павловское ш. 69а – 93а

1. Время производства работ: 20.04.2021 09:30 - 24:00
2. Отключающая арматура расположена: Павловское ш. 69а; Павловское ш. 93а
3. Сливные расположены: врем т/с
4. Количество стыков, заглушек: стыки-Ду150-16шт, Ду65-8шт, Ду50 -8шт
5. Количество сварочных постов: 4шт.
6. С отключением потребителей от ЦО и ГВС: Павловское ш. 93А, 95, 97, 101

| № | Наименование работ | Дата и время работ | Производитель работ | Ответственный |
|---|---|--------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Подача заявки в ЦДС. Получение подтверждения заявки. Взаимодействие с ЦДС ФЭИ. | | ООО «Инженерная Компания» | Н.В.Кравченко |
| 2 | Подача заявки в ЦДО ГУП «ТЭК СПб» | | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | В. В. Золоту |
| 3 | Отключение и опорожнение существующих трубопроводов | 9:30 - 10:30 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | В. В. Золоту |
| 4 | Производство работ по подсоединению построенных трубопроводов т/с | 10:30 - 23:00 | ООО «Инженерная Компания» | Н.В.Кравченко |
| 5 | Заполнение трубопроводов. Подключение абонентов. | 23:00 - 24:00 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | В. В. Золоту |
| 6 | Оповещение ЦДО о завершении работ и подключении потребителей | 24:00 | ДГ РТС ФТС | В. В. Золоту |

1. Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» В. В. Золотухин.
2. Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» О. С. Белов.
3. Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» А. Г. Савинов.
4. Ведущий инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб» Л. А. Кушнарёв. (при условии удовл-х заключен
5. Производитель работ ООО «Инженерная Компания» Н. В. Кравченко. (8-921-553-87-55).

Васильев



Согласовано: ООО «Инженерная Компания»
И. И. Федорова

Согласовано: Санкт-Петербургское ГБУ «Горэлектросеть» учреждение жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского района Санкт-Петербурга

Согласовано: Зам. Главного инженера ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано: Комитет по энергетике

Согласовано: Администрация Пушкинского р-на

Согласовано: 2007, Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., 10

Согласовано:



Согласовано: ГУП «ТЭК СПб»
Производственное управление
СОГЛАСОВАНО
«09» 04 2021

ПРОГРАММА

Производство работ по переключению построенного **прямого и обратного постоянного трубопровода** тепловой сети 2Ду150, Ду65 и Ду50 и объекте: «*Реконструкция тепловых сетей к зданию пансионата ветеранов РАН*» на участке: от Павловское ш. 69а – 93а


1. Время производства работ: 20.04.2021 09:30 24:00
2. Отключающая арматура расположена: Павловское ш. 69а; Павловское ш. 93а
3. Сливные расположены: врем т/с
4. Количество стыков, заглушек: стыки-Ду150-16шт, Ду65-8шт, Ду50 -8шт
5. Количество сварочных постов: 4шт.
6. С отключением потребителей от ЦО и ГВС: Павловское ш. 93А, 95, 97, 101


| № | Наименование работ | Дата и время работ | Производитель работ | Ответственный |
|---|---|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | Подача заявки в ЦДС. Получение подтверждения заявки. Взаимодействие с ЦДС ФЭИ. | | ООО «Инженерная Компания» | <i>Н.В.Кравченко</i> |
| 2 | Подача заявки в ЦДО ГУП «ТЭК СПб» | | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | В. В. Золотухин |
| 3 | Отключение и опорожнение существующих трубопроводов | 9:30-10.30 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | В. В. Золотухин |
| 4 | Производство работ по подсоединению построенных трубопроводов т/с | 10.30-23.00 | ООО «Инженерная Компания» | <i>Н.В.Кравченко</i> |
| 5 | Заполнение трубопроводов. Подключение абонентов. | 23.00-24.00 | РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» | В. В. Золотухин |
| 6 | Оповещение ЦДО о завершении работ и подключении потребителей | 24.00 | ДГ РТС ФТС | В. В. Золотухин |

1. Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____ В. В. Золотухин.
2. Начальник АДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» _____ О. С. Белов.
3. Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» _____ А. Г. Савинов.
4. Ведущий инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб» _____ Л. А. Кушнарёв. (при условии удовл-х заключени
5. Производитель работ ООО «Инженерная Компания» _____ Н. В. Кравченко. (8-921-553-87-55).

Васильев

1.
 Задание: сделать проект по монтажу
 труб водопровода в соответствии с
 чертежом, 65, 50 и учесть водосток и. 63А-83А
 и сделать "Разомкнуть" т.к. в здании имеется
 магистраль по адресу: с. Кукуев, водосток и. 83А

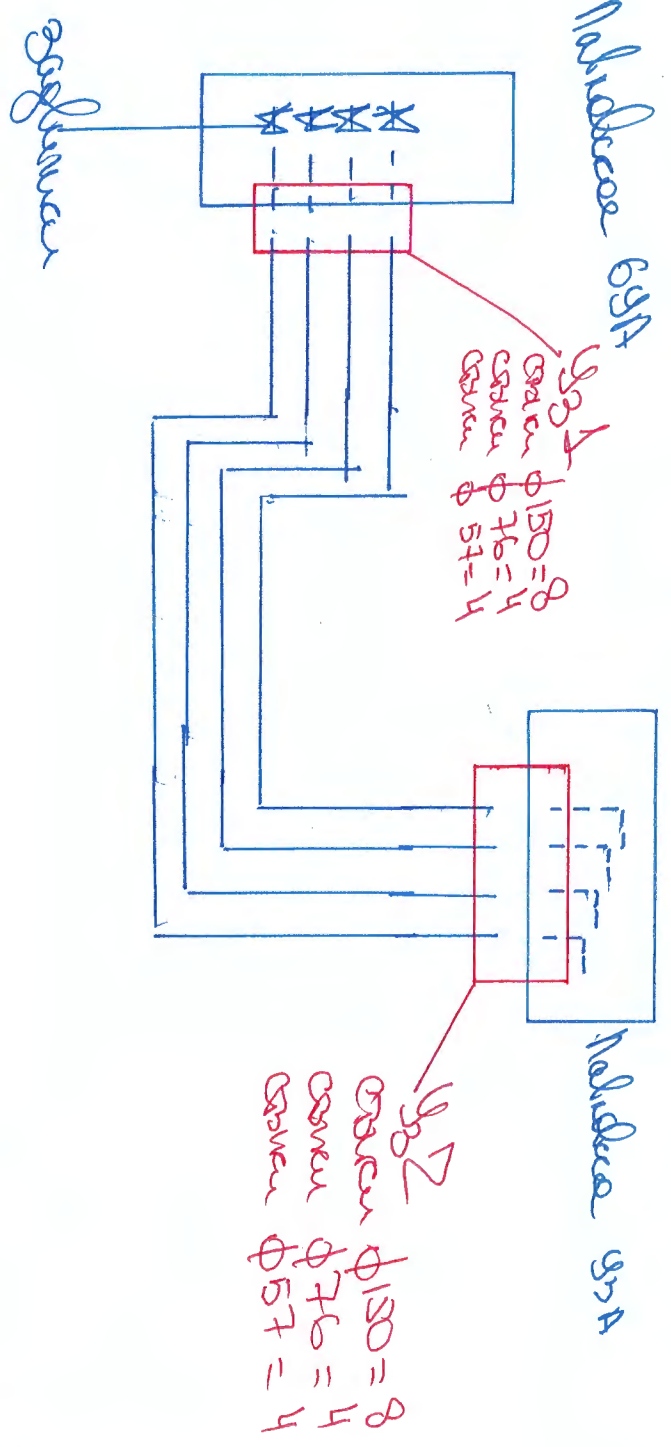

проект

 Копелев
