

Согласовано:

ООО «ЛенСГЭМ»



Согласовано: ТЭК СПб

Производственное управление

СОГЛАСОВАНО

Сайко С.А.

Согласовано:

Главный инженер ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Согласовано:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Согласовано:

Администрация Выборского района

Выборского района

Тел 576-52-47

Согласовано:

Губернатор, Директор

Выборского района

Сайко С.А.

Согласовано:

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Согласовано:

Тех. Директор

Сайко С.А.

Согласовано:

Сайко С.А.

Сайко С.А.

ПРОГРАММА

Производства работ по врезке новой и временной тепловой сети прямого трубопровода

на объекте: Реконструкция тепловых сетей в квартале 18(часть)

на участке: ВТС от д.31 к 29 пр.Пархоменко и от д.29 пр.Пархоменко в сторону д.9 Институтский пр.

Источник тепла: котельная «Дражланская» ГУП «ТЭК СПб»

Время производства работ: с 29.08.2024 г. по 05.09.2024 г.

Дренажушая арматура расположена: суш. ТК 24-а; на ВТС у д.31 пр.Пархоменко

Отключаются арматура находится: В ТК 24-а

С отключением абонентов от ЦО и ДВС: ДА

Сварочных постов - 7 (1 резерв); сварочных звеньев - 7 (1 резерв)

Количество стыков: Ø200=8ст.; Ø100=6ст.; Ø65=9ст.; ДУ50=16ст.; ДУ32=7ст.

Заглушки: Ø100=2 шт.

Отключаемые абоненты: ул.Болотная д. 2/1, 2/2; Институтский пр д.3/1, 3/2, 7, 9; пр.Пархоменко д.31, 29, 30, 32; 2-ой Муринский пр. д.35, 37, 39, 41, 35 ж. Болотная д.6;

Ответственный за производство работ от ООО "ЛенСГЭМ" - Копылов Сергей Викторович +7(999)534-94-90 Институтский пр. д. 3/3, 41

Программа действительна в течении 15 рабочих дней после подписания. Дата и время производства работ будет согласовано с Начальником РТС ГУП "ТЭК СПб" после положительных результатов ЭЭС

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечания
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	20.11.22	ООО «ЛенСТЭМ»	Кольцов С.В.	
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	20.11.22	РТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.	
3	Отключение прямого трубопровода и слив воды:	20.12.22	РТС ГУП «ТЭК СПб» ООО «ЛенСТЭМ»	Прусевич В.С. Кольцов С.В.	
4	Производство работ по врезке временного и нового прямого трубопровода:	21.12.22 - 22.12.22	ООО «ЛенСТЭМ»	Кольцов С.В.	
5	Заполнение временного и нового прямого трубопровода :	22.12.22 - 23.12.22	РТС ГУП «ТЭК СПб» ООО «ЛенСТЭМ»	Прусевич В.С. Кольцов С.В.	
6	Оповещение АДГ ФТС, ЦДС о завершении работ:	23.12.22	ООО «ЛенСТЭМ»	Кольцов С.В.	

Начальник РТС ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Прусевич В.С.

Начальник АДГ ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Белов О.В.

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Савинов А.Г.

Ведущий инженер ОСК по Т/СГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Кольцов П.В. \*

Начальник участка ООО «ЛенСТЭМ» \_\_\_\_\_ Кольцов С.В.


*Согласовано:*

*При предоставлении паспортных данных работников прошу выдать.*

Институтский пр. Д.9

Схема врезки прямого т/п временной и новой тепловой сети

пр. Пархоменко

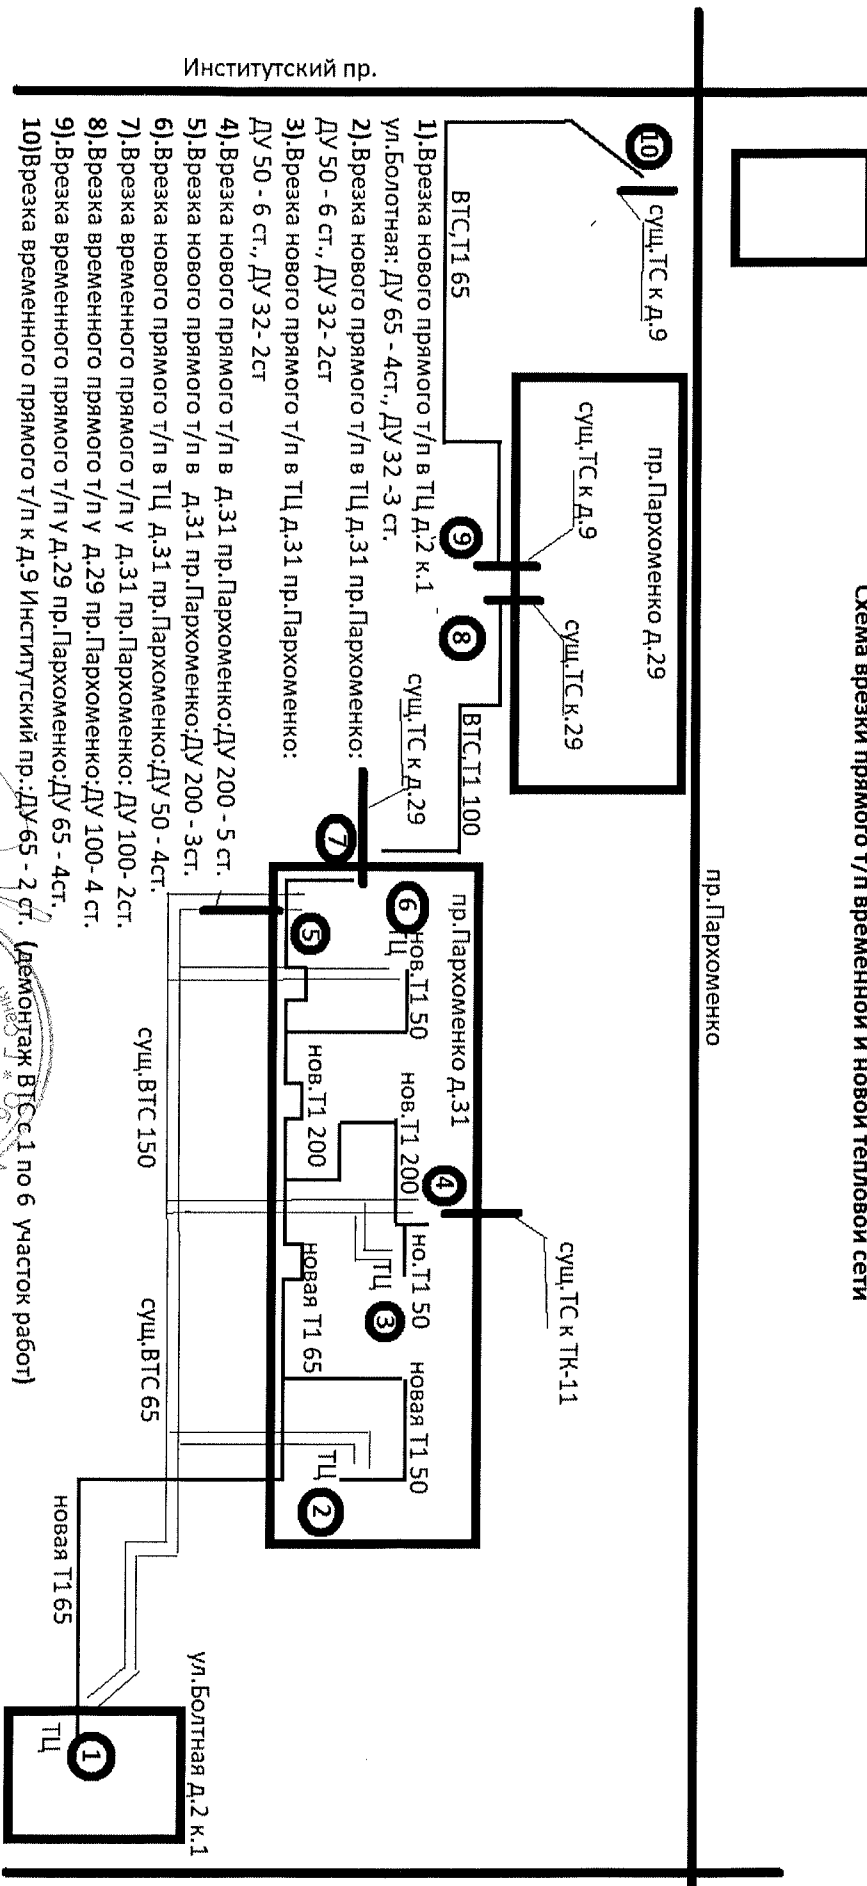

Институтский пр.

ул. Болотная

- 1) Врезка нового прямого т/п в ТЦ Д.2 к.1 ул. Болотная: ДУ 65 - 4ст., ДУ 32 - 3 ст.
- 2) Врезка нового прямого т/п в ТЦ Д.31 пр. Пархоменко: ДУ 50 - 6 ст., ДУ 32 - 2ст
- 3) Врезка нового прямого т/п в ТЦ Д.31 пр. Пархоменко: ДУ 50 - 6 ст., ДУ 32 - 2ст
- 4) Врезка нового прямого т/п в Д.31 пр. Пархоменко: ДУ 200 - 5 ст.
- 5) Врезка нового прямого т/п в Д.31 пр. Пархоменко: ДУ 200 - 3ст.
- 6) Врезка нового прямого т/п в ТЦ Д.31 пр. Пархоменко: ДУ 50 - 4ст.
- 7) Врезка временного прямого т/п у Д.31 пр. Пархоменко: ДУ 100 - 2ст.
- 8) Врезка временного прямого т/п у Д.29 пр. Пархоменко: ДУ 100 - 4 ст.
- 9) Врезка временного прямого т/п у Д.29 пр. Пархоменко: ДУ 65 - 4ст.
- 10) Врезка временного прямого т/п к Д.9 Институтский пр.: ДУ 65 - 2 ст. (демонтаж ВТС 1 по 6 участок работ)

