

Согласовано

Главный инженер

ООО «СК«Имппульс»

Морозов Н.Н.



Согласовано

Согласовано

Зам. гл. Инженера

Фире Г.И. «ТЭК СПб»

192007, Санкт-Петербург, Сайко С.А.



Производства работ по врезке постоянного обратного трубопровода на объекте:

Реконструкция магистральной тепловой сети по Ленской ул. Ул. Коммуны
Время производства работ: с 9.30 по 23.55

Источник теплоснабжения ТЭЦ-5, ПАО «ТЭК-1» Невский филиал

Дренарующая арматура расположена в ТК-10

Отключающая арматура расположена в ТК-6 и ТК-20

Без отключения потребителей от ЦО - 62 здания (кв.5 и 6) на пониженных параметрах, но с отключением ГВС

С отключения потребителей от ЦО, ГВС - 3 здания (ул. Ленская, д.12к1 и 19к1, ул. Хасанская д.15)

Количество стыков Ду700 - 4 шт.

Количество сварочных постов - 3 шт. + 1 запасной

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	08.04.2022	ООО «СК«Имппульс»	Ермаков Р.А. 8(931) 367-52-22
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	08.04.21	РТС ГУП «ТЭК СПб.»	
3	Отключение и опорожнение временного обратного трубопровода	15.04.21 9.30-12:00	РТС ГУП «ТЭК СПб.»	
4	Производство работ по врезке постоянной тепловой сети	15.04.21 12:00 - 20:00	ООО «СК«Имппульс»	Ермаков Р.А. 8(931) 367-52-22
5	Оповещение АДГ ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ	15.04.21 22:00	ООО «СК«Имппульс»	Ермаков Р.А. 8(931) 367-52-22
6	Заполнение постоянного обратного трубопровода	15.04.21 22:00-23:55	РТС ГУП «ТЭК СПб.»	

Начальник Восточного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб.»

Бондарев А.Н.

Начальник АДГ ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Белов О.С.

Начальник УСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

Савинов А.Г.

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

Кустова О.А.


Начальник участка ООО «СК«Имппульс»

Ермаков Р.А.



Программа действительна в течении 30 дней с момента подписания

(руководитель объекта - Александр СЗС)

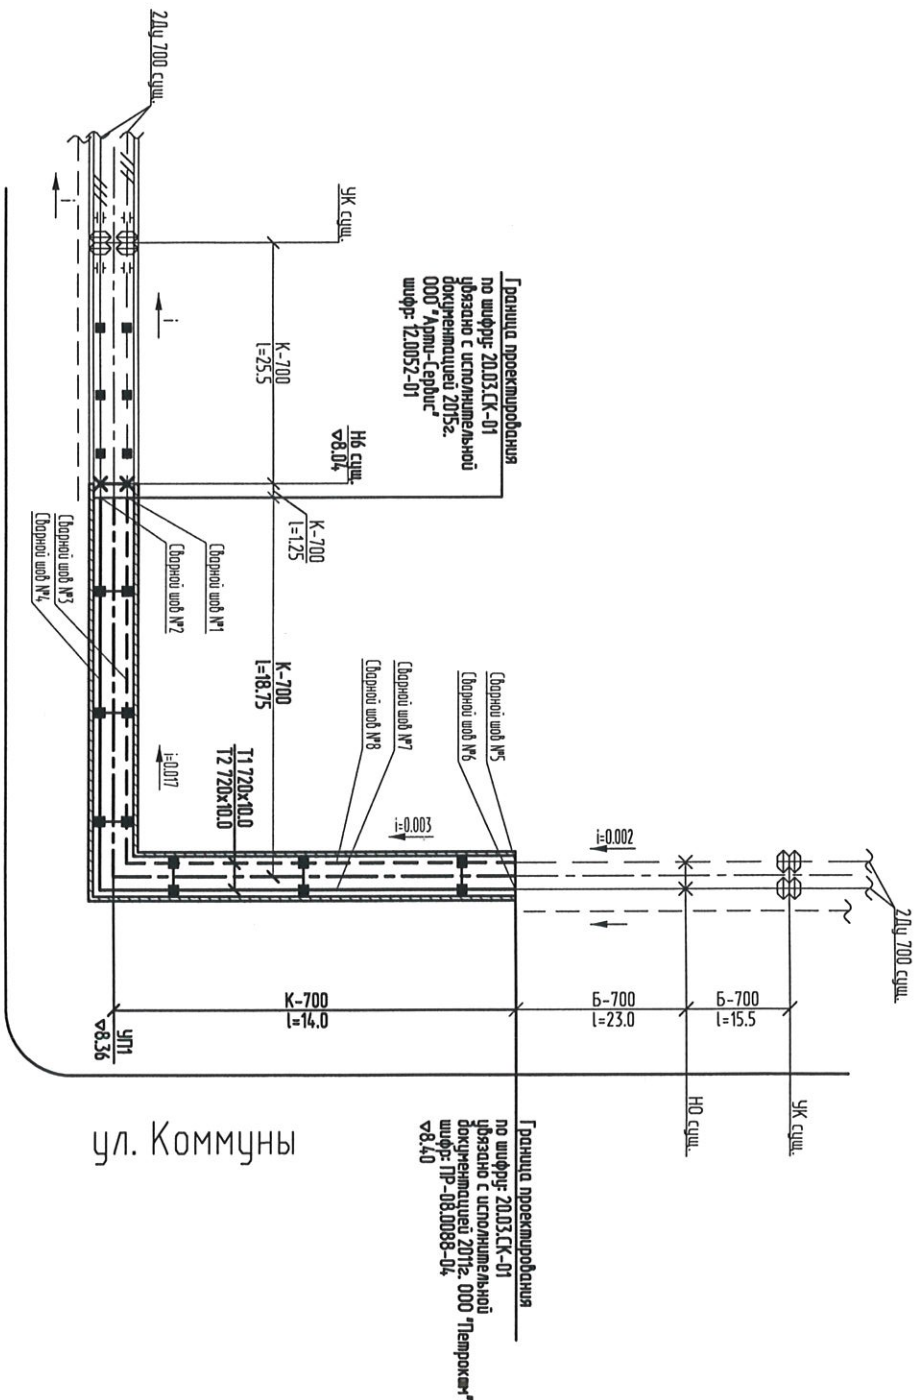

ул. Ленская

ул. Коммуны

Инженер ПТО ООО "СК"Импulse"
 Нач. участка ООО "СК"Импulse"

Царьков А.А.
 Ермаков Р.А.
