


Утверждено  
Генеральный Директор  
ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"  
Серов А.Ю.




Согласовано

Согласовано  
Комитет по энергетике и  
инженерному обеспечению

Согласовано  
Главный инженер  
ЖКС № г. Колпино

Согласовано  
Администрация г. Колпино

Согласовано  
ГКУ ЖА г. Колпино



### ПРОГРАММА

производства работ по подключению вновь смонтированной тепловой сети Ø133 мм; 108 мм; 89 мм; Ø133x8.0/225 в ППУ/ПЭ  
"Касафлекс" Ø143/200ППУ/ПЭ мм; Ø57 (нерж.ст.) "Касафлекс" Ø66/125; "Касафлекс" 163/225; Ø159  
Касафлекс Ø86/145; Ø108 (нерж.ст.); Ø76 (нерж.ст.) Ø219; 133 (нерж. Ст.) на объекте:  
«Реконструкция тепловых сетей г. Колпино в квартале 16, трубопроводы отогреления и ГВС от ЦТП №7 по адресу:  
ул. Ижорского батальона, д.17».

Источник тепла: 2-я Колпинская котельная ТУП «ТЭК СПб»:

Время производства работ Т-1, Т-2, Т-3, Т-4: с 10-00 до 23-00 19.04.2011г.

Отключающая арматура расположена на временном трубопроводе у дома 54 по Тверской улице.

Количество стыков: 26 стыков  
Т1, Т2 Подвал дома 54 по Тверской улице - Т1 Ду 80- 2 стыка, Т2 Ду 80 - 2 стыка

Т3, Т4 Подвал дома 54 по Тверской улице Т3 Ду 80 - 2 стыков, Т4 Ду 50 - 2 стыка

Т1, Т2 Подвал дома 9 Ул. Ижорского Батальона Ду 100 Т1, Т2- 4 стыка

Т3, Т4 Подвал дома 9 Ул. Ижорского Батальона Т3 Ду 80 - 2 стыка, Т4 Ду 50 - 2 стыка

Т1, Т2 Подвал дома 7 Ул. Ижорского Батальона Ду 80 Т1, Т2- 8 стыка

Т3, Т4 Подвал дома 7 Ул. Ижорского Батальона Т3 Ду 100- 2 стыка, Т4 Ду 50 - 2 стыка

Количество сварочных постов:

С отключением ЦО и ГВС

8 постов

Ответственный представитель ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» Генеральный директор Серов А.Ю. тел.: +79218720297  
 Начальник СЗ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" Золотухин В.В.

Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"	за 3 суток	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	Генеральный директор Серов А.Ю.
Подача заявки в ЦДУ ГУП "ТЭК СПб"	за 3 суток	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"	Генеральный директор Серов А.Ю. Начальник РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"
Закрытие задвижек 2Ду150 мм., на обратном и прямом трубопроводе Т1, Т2, Т3 - Ду100 и Т4 - 125 на обратном и прямом трубопроводе на временном трубопроводе у дома 54 по Тверской улице.	19.04.21 г. с 10-00 до 11-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"	Генеральный директор Серов А.Ю. Начальник РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"
Производство работ по монтажу прямого и обратного трубопровода Т1, Т2 - Ду 100,80	19.04.21 г. с 11-00 до 24.00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	Генеральный директор Серов А.Ю.
Производство работ по монтажу прямого и обратного трубопровода Т3, Т4 - Ду 80,50	19.04.21 г. с 24.00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"	Генеральный директор Серов А.Ю.
Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" о завершении работ по монтажу труб на временном прямом и обратном трубопроводе.	19.04.21 г. с 21-00 до 23-00	ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" СРТС ГУП "ТЭК СПб"	Генеральный директор Серов А.Ю. Начальник РТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Производство работ производить при температуре не ниже -5С

Программа действует в течение 10 дней.

Под отключение ЦО и ГВС попадают: 2 - жилых здания - ул. Ижорского Батальона 9,7

Начальник ПРТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Начальник ДС ФЭИ ГУП "ТЭК СПб"

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"

Начальник УСК по ГУП "ТЭК СПб"

Начальник участка ООО "ИК Энергия"

Генеральный директор ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"

*В.В. Золотухин*

Золотухин В.В.


Белов О.С.

Красковская Ю.В.

Савинов А.Г.

Кондрашин М.В.

Серов А.Ю.




*А.Ю. Серов*

# Схема переключения

Начальник  
СЗ, ЦТС ФТС ГУП "ТЭК СПб"  
Золотухин В.В.

Ведущий инженер  
ООК по ТС ГУП "ТЭК СПб"  
Красковская Ю.В.

Генеральный Директор  
ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"  
Серов А.Ю.

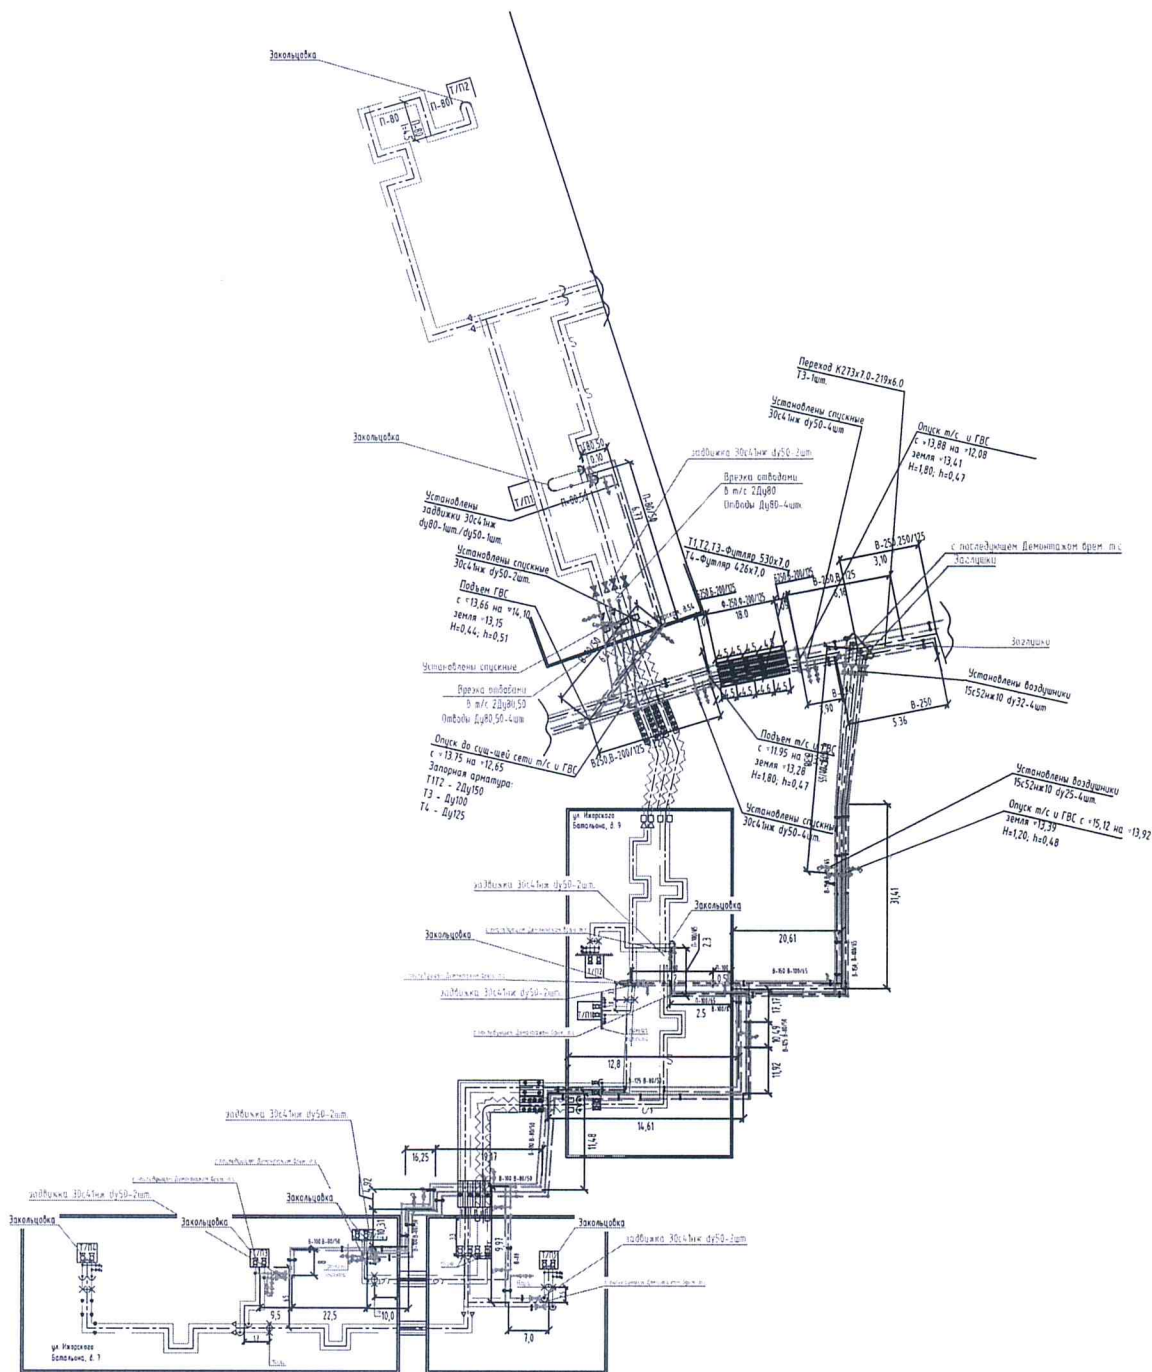

			<b>2/106-17-ТКР-1</b>				
			Реконструкция тепловых сетей г. Колпино в квартире 16, трубопроводы отопления и ГВС от ЦТП №7 по адресу: ул. Ижорского батальона, д. 17				
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
				Тепловые сети	ГИ	1	1
				Схема переключения ЦО и ГВС		ООО "СтройИнжиниринг"	
