

Утверждено:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Генеральный Директор

Зам. Главного инженера

Администрации

ГУ ЖА

Комитет по энергетике

и инженерному обеспечению



ФТС ГУП «ТЭК СПб» Краевая энергетическая районная энергетическая организация
Филиал тепловых сетей
192007, Санкт-Петербург, Шадриновский пр. д. 17, 9
Шадриновский пр. д. 17, 9
г. Санкт-Петербург



3111 7К-267
Муса

ГУП «ТЭК СПб»
Пронзвольственное управление
СОГЛАСОВАНО
«13» 04 2021 г.

ПРОГРАММА

Предметы работ по подключению Постоянного «*Мельнич*» трубопровода 2 Ду426, 2 Ду325. Ду219 по адресу: Реконструкция тепловых сетей вдоль Шадриновский пр. от ТК-2 до Шадриновский пр. д. 17. На Участке : От ТК-2 до Врезки №3

Источники тепла: котельная «Котельная Пискаревская»

Время производства работ: с 9:00 до 02:00) - трубопроводы ЦО

15.04.2021 г. - 16.04.2021 г.

Отключающая арматура расположена: в ТК-2(Суц)

С отключением ГВС и ЦО по *Мельнич* и *Братского* трубе

Количество стыков: Ду426=6шт; Ду325= 8шт, Ду219=6шт «*Мельнич* и *Братского*» трубопроводах

Количество сварочных постов: 3 постов + 2 в резерве

Подключение ЦО и ГВС подается: Шадриновский пр. д. 2, 4, 6, 6(а), 8, 15, 17, 12(Шадриновская 6-Крематорий), Пискаревский пр. д. 59(а), Екатерининский 21.

Среди отключаемых:

Программа действует 1 месяц.

№, п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	За трое суток	ООО «СК Сеть Энерго»	И.А. Власов
2	Подана заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	За трое суток	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	В.С. Прусевич
3	Отключение и опорожнение существующих трубопроводов	с 9:30 до 11:30	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	В.С. Прусевич
4	Производство работ по врезке Постоянного трубопровода Стыки: Ду426=6шт, Ду325=8шт, Ду219=6шт. Сварочные посты: 3 шт. + 2 в резерве	с 11:30 до 00:00	ООО «СК Сеть Энерго»	И.А. Власов
5	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ на трубопроводах	с 00:00 до 00:30	ООО «СК Сеть Энерго»	И.А. Власов
6	Заполнение трубопроводов	с 00:30 по 01:00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	В.С. Прусевич

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЭС.

1. Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

2. Начальник Северного РТС ГУП «ТЭК СПб»

3. Ведущий инженер ОСК ТС ГУП «ТЭК СПб»

4. Ответственный за производство работ
Производитель работ ООО «СК Сеть Энерго»

И.А. Власов

 Инженер

А.Г. Савинов

В.С. Прусевич

М.А. Кабанин *

И.А. Власов +7 (906) 279-98-60

** Время работы с 9:30 15.04.2021 до 02:00 16.04.2021*

И. В. Гусев
28.05.2017 г.

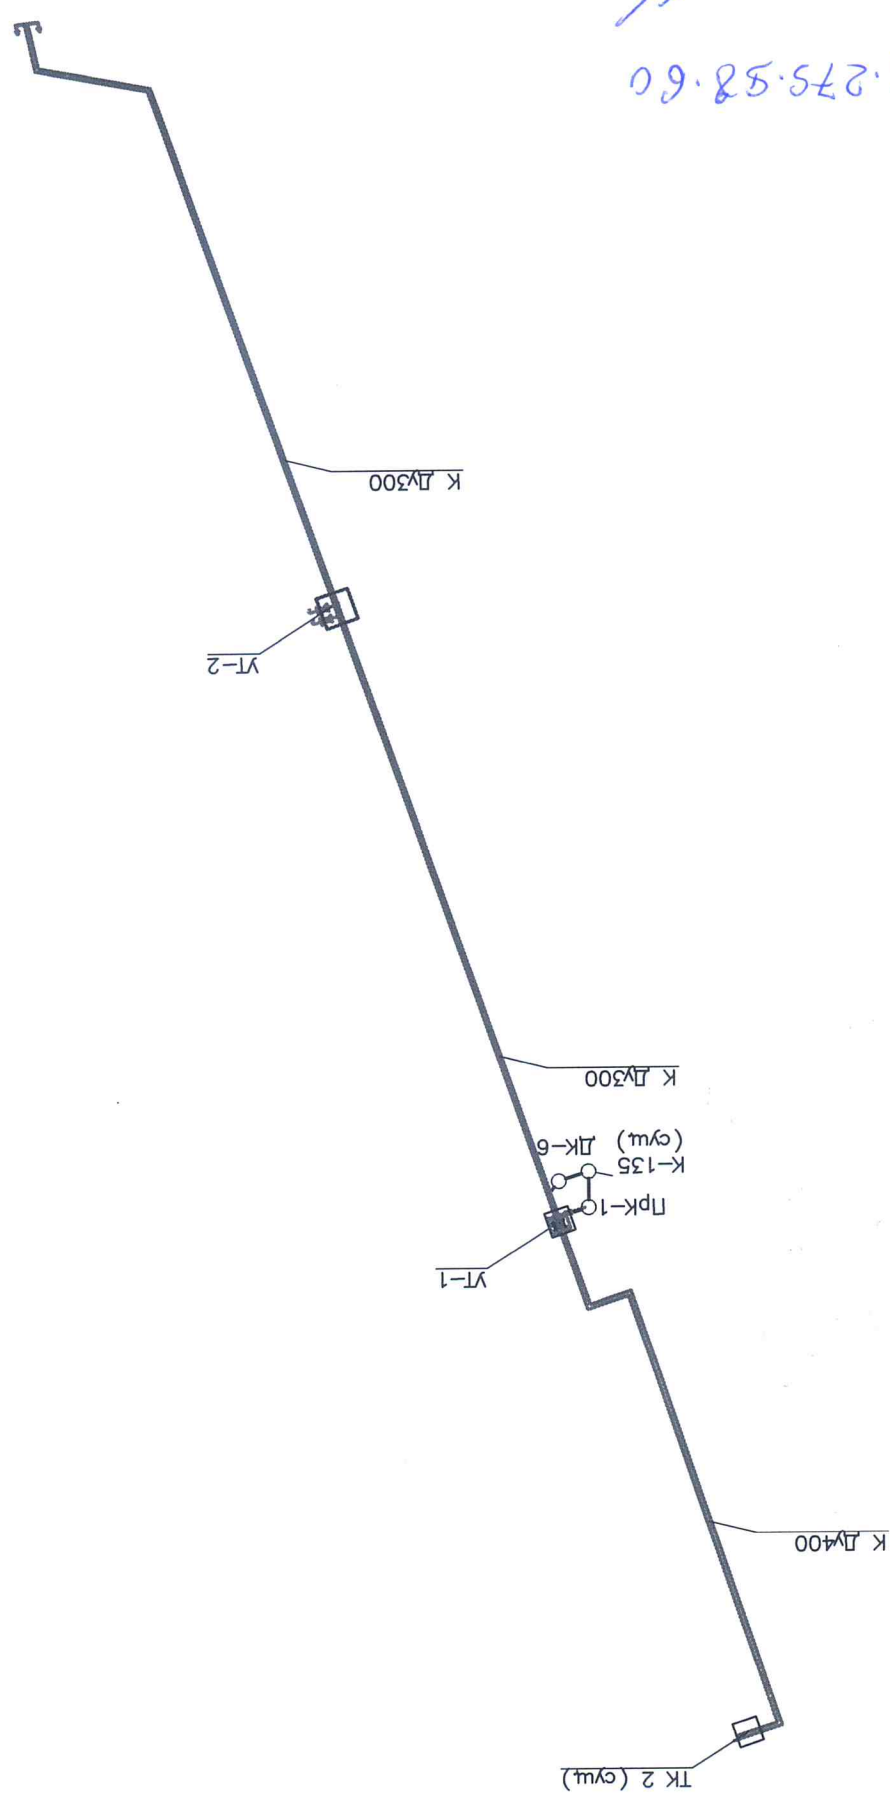


Схема подключения внешнего трубопровода по объекту:
реконструкция мейл вгль Шафробского пр.
от ТК-2 го Шафробского пр., г.17.
