

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО «Строй Альянс»



Согласовано:
 Зам. главного инженера
 ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано:
 Главный инженер
 ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Согласовано:
 Администрация Выборгского
 Выборгского района
 Санкт-Петербурга



С.А. Сайко
 Согласовано:
 КЭНИО



Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода Ду300, на объекте: объекте:
 «Реконструкция объекта незавершенного строительства под центр культурного развития с временным проживанием»
 по адресу: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. д. 36, лит. А.

Участок: Ю на тепловых сетях в границах земельного участка ООО «СтройАльянс»
 Время производства работ: с 8:00 до 23:00 24.11.2020
 Дренажная арматура: ТК-5, ТК-4а.
 Отключенная арматура расположена: арматура Ду300 в ТК-5 и ТК-4а
 Без отключения / с отключением потребителей от ЦО (ТВС)
 Количество абонентов подающих потребителей от ЦО: 7
 Количество стыков, заглушек: Ду300 – 8 ст.;
 Количество сварочных постов: 2

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦО Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	20.11.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
2	Подача заявки в ЦО ГУП «ТЭК СПб»	20.11.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Отключение и опорожнение прямого и обратного трубопровода ТС	с 8:00 до 10:00 24.11.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО «Строй Альянс»
 М.В. Висленский
 Согласовано:
 ГКУ ЖА
 Выборгского
 района

Согласовано:
 Зам. главного инженера
 ФТЭС ГТУП «ТЭК СПб»
 Фридрихсбургский район
 192007, Санкт-Петербург
 Английский пр., д. 36, лит. А

Согласовано:
 Главный инженер
 ФЭН ГТУП «ТЭК СПб»
 Калинин И.А.


Согласовано:
 Администрация Выборгского
 района

Производства работ по врезке по лямпоче и обратного врезкиного трубопровода ДУ300, на объекте: объекте:
 «Реконструкция объекта незавершенного строительства под центр кувальдного развития с временным проживанием»
 по адресу: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. д. 36, лит. А.

ПРОГРАММА (РЕВ) P/CHL

Участок: УЩО на тепловых сетях в границах земельного участка ООО «СтройАльянс»
 Время производства работ: с 8-00 до 23-00 24.11.2020
 Дренирующая арматура: ТК-5, ТК-4а.
 Отключающая арматура расположена: арматура ДУ300 в ТК-5 и ТК-4а
 Бет отключения / с отключением потребителей от ЦО (ПВС)
 Количество абонентов подключаемых под отключение ЦО: 7
 Количество стяжков, запущенных: ДУ300 – 8 ст.
 Количество сварочных постов: 2

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ДУ Северного РТС ФТЭС ГТУП «ТЭК СПб»	20.11.2020 г.	ООО «ПАВВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
2	Подача заявки в ЦО ГТУП «ТЭК СПб»	20.11.2020 г.	Северный РТС ФТЭС ГТУП «ТЭК СПб»	Присевич В.С.
3	Отключение и опорожнение прямого и обратного трубопровода ТС	с 8:00 до 10:00 24.11.2020 г.	Северный РТС ФТЭС ГТУП «ТЭК СПб»	Присевич В.С.



 M.B.

 СІТІСӨБІНІҢ:

 БАБОТИСКОГО ПАЙОЛІА


 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ

Қашқары

 19.11.2020

 10

 748 > -50



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСАУ САНАМАНЫҢ

4	Производство работ по врезке обратного временного трубопровода Стыки: Ду300 – 4 ст.;	с 10:00 до 17:00 24.11.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
5	Оповещение ДГ Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ на обратном трубопроводе ТС	в 17:00 24.11.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
6	Заполнение и запуск в рабочий режим обратного трубопровода	с 17:00 до 19:00 24.11.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
7	Производство работ по врезке прямого временного трубопровода Стыки: Ду300 – 4 ст.;	с 10:00 до 21:00 24.11.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
8	Оповещение ДГ Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ на прямом трубопроводе ТС	в 21:00 24.11.2020 г.	ООО «ПАВИР»	Бословяк В.А. 8-905-268-73-76
9	Заполнение и запуск в рабочий режим прямого трубопровода	с 21:00 до 23:00 24.11.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Начальник Северного РТС ФТС
ГУП «ТЭК СПб»

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК
СПб»

Начальник ОСК по РСО ГУП
«ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по
РСО ГУП «ТЭК СПб»

Прусевич В.С.

Белов О.С.

Хилько Л.В.

Нелобов В.Р.


Производитель работ
ООО «ПАВИР»



СХЕМА

Производства работ по врезке прямого и обратного трубопровода Ду300 на объекте: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под центр культурного развития с временным проживанием»
по адресу: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. д. 36, лпг. А.

Участок: у НО на тепловых сетях в границах земельного участка ООО «СтройАльянс»

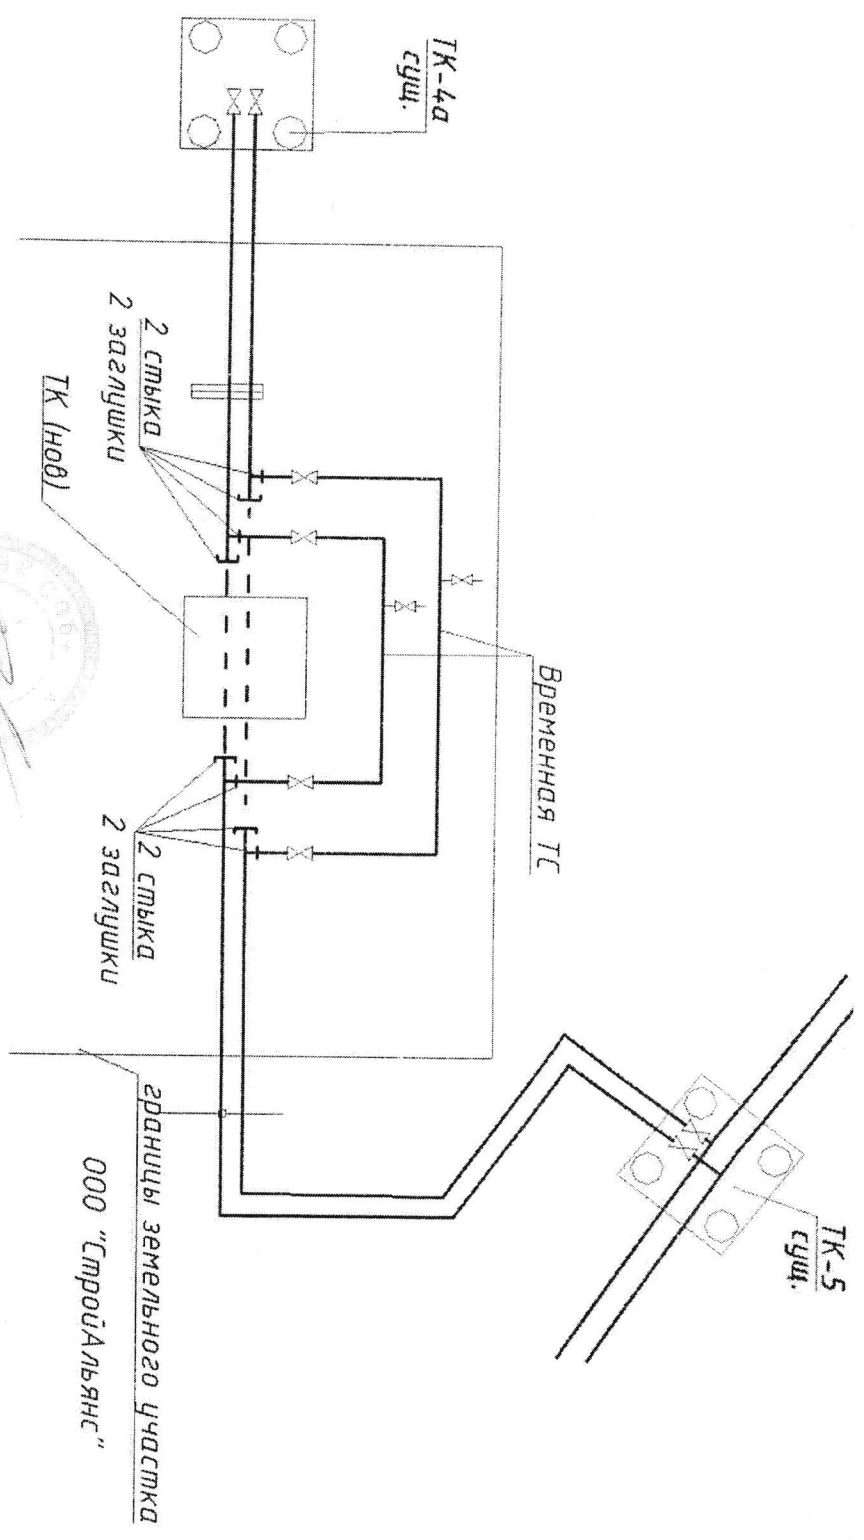

Ведущий инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб»

Начальник Северного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ ООО «ПАВИР»


Неглобов В.Г.

Прусевич В.С.

Бословяк В.А.



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «СтройАльянс»



М.В. Введенский


График производства работ

По врезке прямого и обратного временного трубопровода Ду300 на объекте: «Реконструкция объекта незавершенного строительства под центр культурного развития с временным проживанием» по адресу: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр. д. 36, лит. А.
Кол-во сварочных постов : 2

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Кол-во сварочных постов	Примечание
1	Монтаж трубы Ду300 на прямом и обратном трубопроводе	с 8:00 до 23.00 24.11.2020 г.	2 св. поста	

Ответственный за производство работ:

Производитель работ ООО «ПАВИР»
т. 8-905-268-73-76



Бословик В.А.
