


Согласовано:  
Ген. директор  
ООО «ЛенСГЭМ»

  
Беккер Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ


Согласовано: ГОСКОГО РАЙОНА  
Администрация ПЕТЕРБУРГА  
Выборского района ХОЗЯЙСТВА  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА



Согласовано:



Согласовано: \* ГО  
Главный инженер ФТС ГУП  
«ТЭК СПб»

  
Иванов И.И.



Согласовано:

Согласовано: ГОСКОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ГУЖА - Ленинград  
Выборского района





Проектирования работ по врезке временной тепловой сети прямого и обратного трубопровода  
на объекте: Реконструкция тепловых сетей в квартале 18(часть)  
на участке: от ТК-1(суш.) до д.10, д.8, д.6 к.1, д.4 к.1 по ул. Карбышева

**ПРОГРАММА**


Согласовано:  
Главный инженер ФТС ГУП  
«ТЭК СПб»

  
Сайко С.А.

Федеральное государственное учреждение  
«Центр энергетических сетей»  
192007, Санкт-Петербург, Сайко С.А.  
Андреевская ул., д. 59

Согласовано: «ТЭК СПб»  
Проектное управление  
СОГЛАСОВАНО






Согласовано:  
Комитет по энергетике и  
инженерному обеспечению



Согласовано:  
Иванов И.И. - 33

  
Иванов И.И.




Источник тепла: котельная «Гражданская» ГУП «ТЭК СПб» 90  
Время производства работ: 3.12.2020 с 9:00 до 21:00  
Дренажирующая арматура расположена: В ТК-1(суш.)  
Отключенная арматура находится: В ТК-1(суш.), в подвале д.6 к.2 ул. Карбышева  
С отключением абонентов от ЦО и ГВС: Да  
Сварочных постов - 4; сварочных звеньев - 6  
Количество стыков: Ø250=4 шт.; Ø200=4шт.; Ø80=12шт.; Ø50=8шт.; Ø65=12шт  
Заглушки: нет  
Отключаемые абоненты: ул. Карбышева д.10, д.8, д.6 к.1, д.4 к.1; *Иванов И.И. 9.45 11.14*  
Ответственный за производство работ от ООО «ЛенСГЭМ» - Колынов Сергей Викторович +7(999)534-94-90  
Программа действительна в течении 15 рабочих дней после подписания. Дата и время производства работ будет согласовано с Начальником РТС ГУП «ТЭК СПб» после положительных результатов СЭС

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечания
1	Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	1.12.2020 08:14 <sup>00</sup>	ООО «ЛенСГЭМ»	Кольцов С.В.	
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	1.12.2020 09:14 <sup>00</sup>	РТС ГУП «ТЭКСПб»	Трудовик В.С.	
3	Отключение прямого и обратного трубопровода и слив воды:	3.12.2020 09:00 <sup>00</sup> до 10 <sup>00</sup>	РТС ГУП «ТЭКСПб» ООО «ЛенСГЭМ»	Трудовик В.С. Кольцов С.В.	
4	Производство работ по врезке временного прямого и обратного трубопровода:	10 <sup>00</sup> до 20 <sup>00</sup> 3.12.2020	ООО «ЛенСГЭМ»	Кольцов С.В.	
5	Заполнение временного прямого и обратного трубопровода:	20 <sup>00</sup> до 21 <sup>00</sup> 3.12.2020	РТС ГУП «ТЭК СПб» ООО «ЛенСГЭМ»	Трудовик В.С. Кольцов С.В.	
6	Оповещение АДС ФТС, ЦДС о завершении работ:	21.12.2020 06:29 <sup>00</sup>	ООО «ЛенСГЭМ»	Кольцов С.В.	

ГУП «ТЭК СПб»  
Финансг тепловых сетей  
~~Директор~~  
Свердловский район тепловых сетей

Начальник РТС ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Трудовик В.С.  
 Начальник АДС ФТС ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Белов О.В.  
 Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Савинов А.Г.  
 Ведущий инженер ОСК по Т/СГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_ Каптыгов П.В.  
 Начальник участка ООО «ЛенСГЭМ» \_\_\_\_\_ Кольцов С.В.

Разрешается производить работы только в присутствии  
 одного работника  
 на территории



\_\_\_\_\_

ул. Карбышева

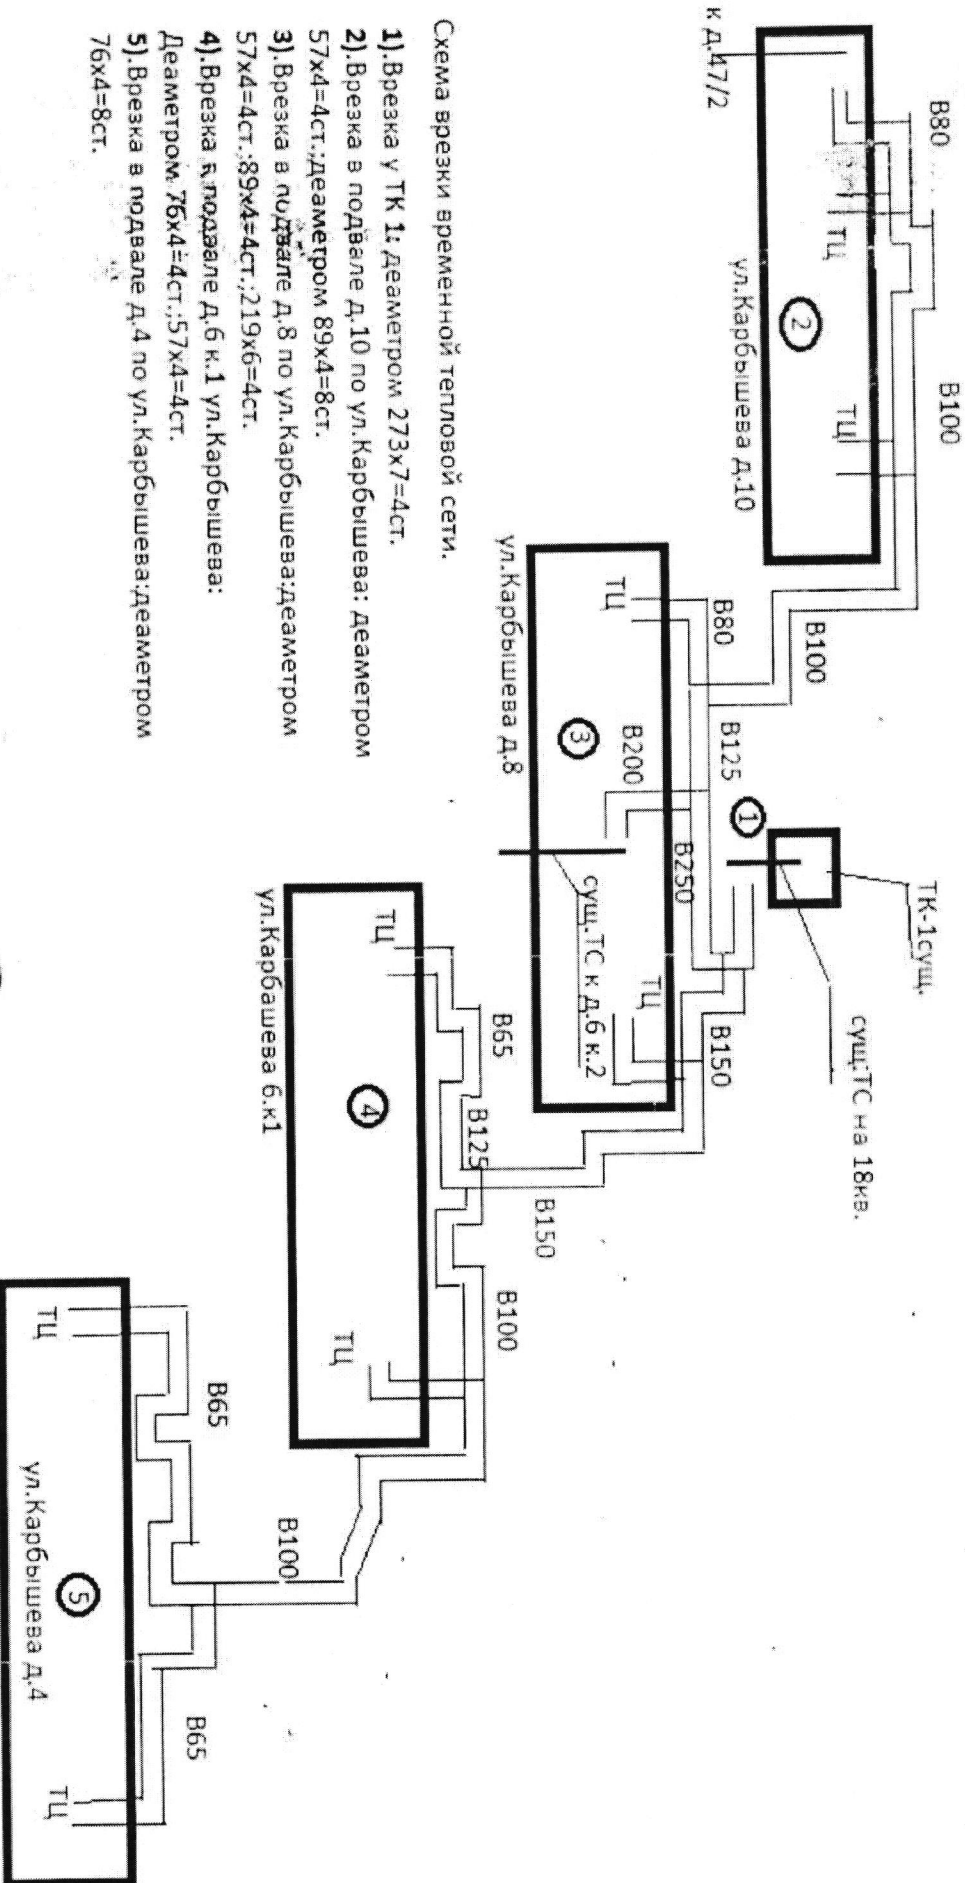


Схема врезки временной тепловой сети.

- 1). Врезка у ТК 1: Диаметр 273х7=4ст.
- 2). Врезка в подвале Д.10 по ул. Карбышева: Диаметр 57х4=4ст.; Диаметр 89х4=8ст.
- 3). Врезка в подвале Д.8 по ул. Карбышева: Диаметр 57х4=4ст.; 89х4=4ст.; 219х6=4ст.
- 4). Врезка в подвале Д.6 к.1 ул. Карбышева: Диаметр 76х4=4ст.; 57х4=4ст.
- 5). Врезка в подвале Д.4 по ул. Карбышева: Диаметр 76х4=8ст.

*З. Карбышев С.13.*
