

«Согласовано»:
 Зам.гл. инж. ФТС ГУП «ТЭК СПб»
 Директор ООО «ТЭС Инновации»
 Д.В. Силецкий

«Согласовано»:
 Главный инженер ФЭН ГУП «ТЭК СПб»
 И. А. Калашов

«Согласовано»:
 Директор ООО «ТЭС Инновации»
 СОГЛАСОВАНО
 «ТЭ» 04 2021 г.

«Согласовано»:
 Зам.гл. инж. ФТС ГУП «ТЭК СПб»
 Директор ООО «ТЭС Инновации»
 Д.В. Силецкий

ПРОГРАММА (РСБ)

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 7 СУН» (от ул. Антонова-Овсенко, д.1, к.3 до д.5, к.2 по ул. Антонова-Овсенко) на объекте:

Время производства работ: с 9:30 19.04.2021 до 22:00 19.04.2021
 Дренажная арматура расположена: ЦТП (ул. Антонова-Овсенко, д.1, к.3)
 Отключающая арматура расположена: ЦТП (ул. Антонова-Овсенко, д.1, к.3)
 Количество стыков: 5 стыков Ду 150 *Застыла Ог 200*
 Под опломбирование попадают 2 здания, из них: Жилые - 2 (ул. Антонова-Овсенко д.3, к.1, ул. Антонова-Овсенко д.1, к.2)

Согласовано
 с поперечной стыковкой
 Трубопровода

№	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечание
1.	Подача заявки в ДГ Восточный РТС ГУП «ТЭК СПб». Получение подтверждения заявки. Взаимодействие с ДГ Восточный РТС ГУП «ТЭК СПб».	15.04.21	ООО «ТЭС Инновации»	Кавалеров В.М.	8-921-921-25-25
2.	Подача заявки в ЦТП ГУП «ТЭК СПб».	15.04.21	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
3.	Отключение и опломбирование трубопроводов т/с	17.04.21 с 09:30 до 11:00	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
4.	Производство работ по врезке временного трубопровода т/с	18.04.21 с 11:00 до 20:00	ООО «ТЭС Инновации»	Кавалеров В.М.	8-921-921-25-25
5.	Оповещение ЦДС филиала тепловых сетей о завершении работ.	18.04.21 20:00	ООО «ТЭС Инновации»	Кавалеров В.М.	8-921-921-25-25
6.	Заполнение временного трубопровода	с 20:00 до 22:00 19.04.21	Восточный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68

Переклопоченно разрешается после предоставления положительного заключения СЭС

Схема переклопочения прилагается. Программа действительна в течение одного месяца.

Производитель работ ООО «ТЭС Инновации» / Кавалеров В.М./

Ведущий инженер ОСК по ТЭС ГУП «ТЭК СПб» / Кустова О.А./

Начальник ВРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» / Бондарев А.Н./

Начальник ДС ГУП «ТЭК СПб» / *бсе* / Белов С.С./


Начальник ДГ Восточного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» / Александрова Л.В./

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» / Савинов А.Г./

Начальник отдела работ -
 Кавалеров В.М.

Агентство
 Инновации
 Механика

Михайлов В.П.



Бурнакова
 Губкина
 Валентина

Handwritten signature

Исполнительный директор
ООО «ГЭС «Анновский»
Д.В. Салетский

Зам. главного инженера
ФСТ «ГЭС Сибирь»
ГУП «ГЭС Сибирь» Саяно-Энерго
Филиал тепловых сетей
192007, Санкт-Петербург,
Андропольская ул. д. 9, к. 2

Главный инженер
ФРЭИГУП «ГЭС Сибирь»
И.А. Калянов
ПРОГРАММА (РСБ)

Производственное управление
СОГЛАСОВАНО
« ГЭС Сибирь » 2021 г.

Производство работ по врезке временной тепловой сети - А.1.50 «Реконструкция тепловых сетей в квартале 7 СУИ» (от ул. Антонова-Овсенко, д.1, к.3 до д.5, к.2 по ул. Антонова-Овсенко) на объект «ГЭС Сибирь»

Время производства работ: с 9:30 19.04.2021 до 22:00 19.04.2021

Дренарующая арматура расположена: ЦТП ул. Антонова-Овсенко, д.1, к.3

Отключающая арматура расположена: ЦТП (ул. Антонова-Овсенко, д.1, к.3)

Количество стыков: **5** стыков, Ду150

Подотключение по п.10 л.2 здания, в пун: Жилые - 2 (ул. Антонова-Овсенко, д.3, к.1, ул. Антонова-Овсенко, д.1, к.2)

№	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечание
1.	Начала заявки в ДГ Восточной РЭС ГУП «ГЭС Сибирь» Получение подтверждения заявки. Взаимодействие с ДГ Восточной РЭС ГУП «ГЭС Сибирь».	15.04.21 с 09:30 до 14:00	ООО «ГЭС Инновация»	Калашников В.М.	8-921-921-25-25
2.	Подача заявки в ЦТП ГУП «ГЭС Сибирь».	15.04.21 с 19:00 до 20:00	Восточная РЭС ФСТУИ «ГЭС Сибирь»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
3.	Отключение и опорожнение трубопроводов т/с	19.04.21 с 09:30 до 14:00	Восточная РЭС ФСТУИ «ГЭС Сибирь»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68
4.	Производство работ по врезке временного трубопровода т/с	19.04.21 с 11:00 до 20:00	ООО «ГЭС Инновация»	Калашников В.М.	8-921-921-25-25
5.	Оповещение ЦДС филиала тепловых сетей об завершении работ.	19.04.21 с 20:00 до 22:00	ООО «ГЭС Инновация»	Калашников В.М.	8-921-921-25-25
6.	Заполнение временного трубопровода	19.04.21 с 20:00 до 22:00	Восточная РЭС ФСТУИ «ГЭС Сибирь»	Бондарев А.Н.	8-921-950-87-68

Переключенные разрешения после предоставления положительного заключения СЭС

Схема переключения прилагается. Программа действительна в течение одного месяца.

Производитель работ ООО «ГЭС Инновация»

Ведущий инженер ОСК по ТСТУИ «ГЭС Сибирь»


Начальник ВРЭС ФСТУИ «ГЭС Сибирь»

Начальник ДС ФСТУИ «ГЭС Сибирь»

Начальник ДГ Восточной РЭС ФСТУИ «ГЭС Сибирь»


Начальник УСК ГУП «ГЭС Сибирь»

Начальник отдела район.
Игорь Коржиков
Александр Никитинский
Рябенко
Михайлов В.П.



Зам. заместителя
ГКУ ИА Невского района
Рябенко
Бурная
Гавришча
Валентина

И.А. Калянов
Савинов А.Г.

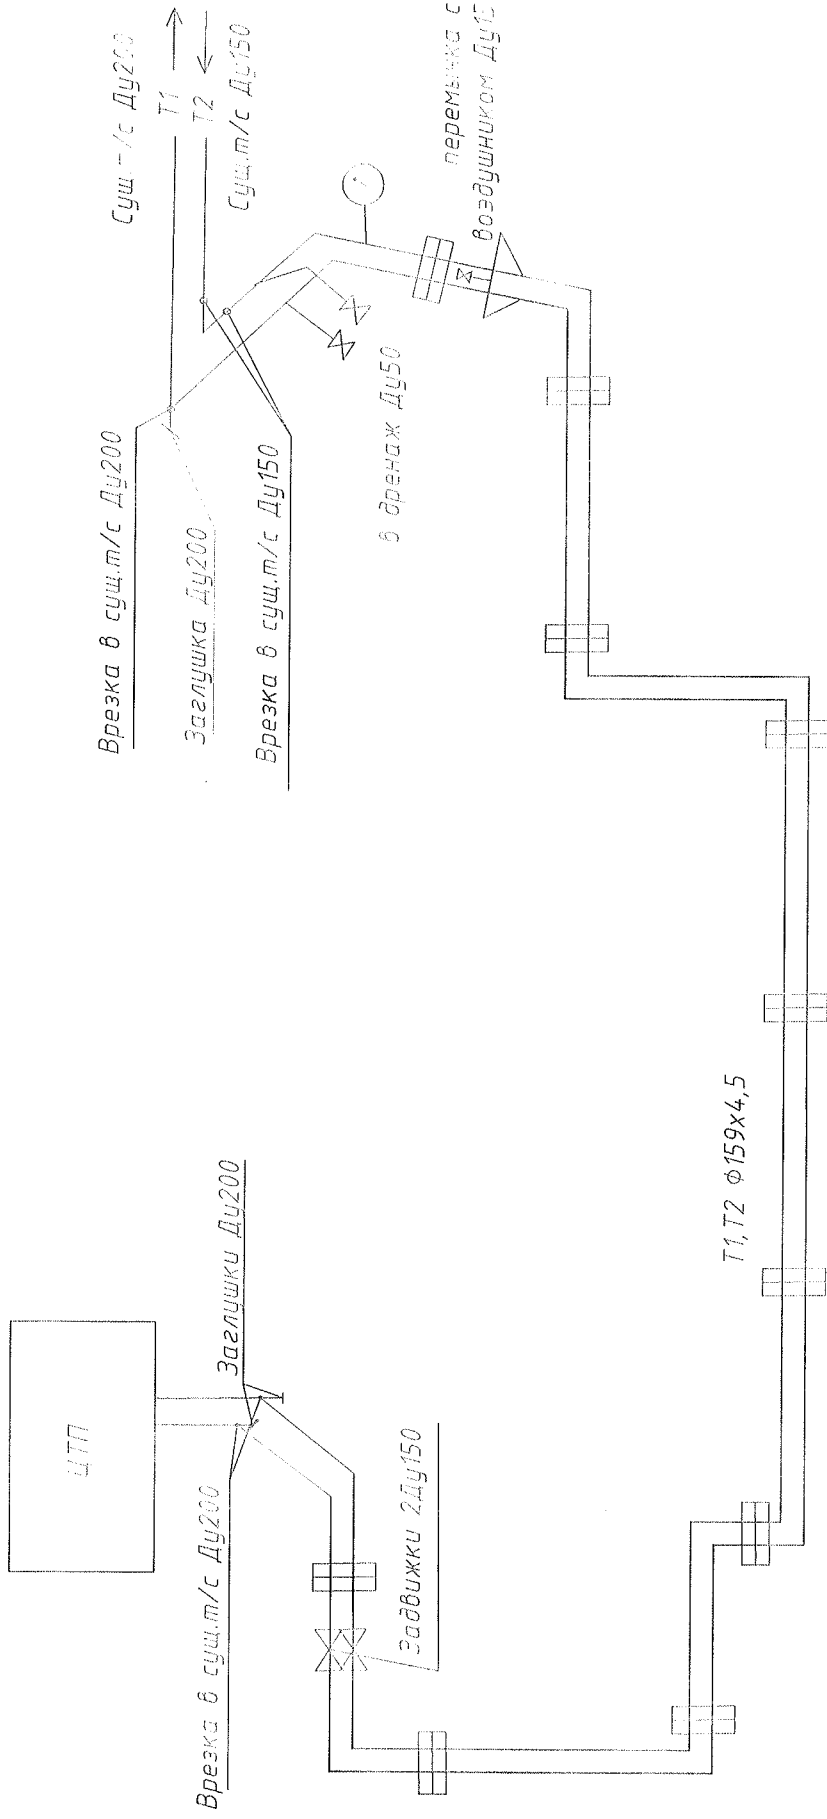

2-64-18-01		а.Санкт-Петербурга, Невский район, квартал 7 СЭН		Страница	Лист	Листов
				1		
				Реконструкция тепловых сетей в квартале 7 СЭН		
				Схема врезки в сущ.т/с Ду150 в сущ.т/с на участке ЦТП - 7.5 кв. м.		
Имя	Фамилия	Подпись	Дата			
Разработал	Облицеров	<i>[Signature]</i>	04.06.2002			
Проверил	Облицеров	<i>[Signature]</i>	04.06.2002			
Н.контр.	Сидоров	<i>[Signature]</i>	04.06.2002			

№10.№подл.	Подпись и дата	Взвешен инв.№	Составлено:
