

Согласовано:
Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал теплоснабжения
С.А. Сайко
192007, Санкт-Петербург,
Днепрпетровская ул., д. 69

при ТМВ
не менее -5°C.

Согласовано
Производственно-управление
ГУП «ТЭК СПб»
Согласовано
«02» 02 2021 г.

Согласовано
при условии модернизации
ГУП ТЭК о отключении
М.А. Дубинин П.С. Кес
Евгений В. В.

Согласовано:
_____ / _____

Администрация
Выборгского района
Санкт-Петербурга
Отдел районного хозяйства
и благоустройства
Администрация
Выборгского района
ТЕЛ 576-52-47

Согласовано:
_____ / _____

Согласовано:
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению
_____ / _____

Утверждаю:



Руководитель проекта
АО «МегаМейд»
А.В. Грякалов

ПРОГРАММА (РСБ)

Производства работ по присоединению вновь построенной временной тепловой сети на участке от границы работ у ТК «НОРД» до границы работ у метро «проспект Просвещения», расположенной на объекте: «Реконструкция тепловых сетей по пр. Энгельса от ТК-168 по пр. Просвещения к ТК-2 у метро "Проспект Просвещения".

1. Время производства работ:
 - 1.1. **Подающий** трубопровод (Т1) «02» 03.2021г. с 10.00 до 2.30 «04» 03.2021г.
 - 1.2. **Обратный** трубопровод (Т2) «26» 02.2021г. с 10.00 до 16.00 «01» 03.2021г.
2. Отключающая арматура расположена: ТК-166, УТ-1, ТК-2.
3. Дренажирующая арматура расположена: УТ-2, ТК-166, ТК-168.
4. Количество зданий, попадающих под отключение ЦО и ГВС: 2.
5. Количество сварных стыков: Ду 1000 мм – 8 шт; Ду 600 мм – 6 шт.
6. Количество сварочных постов: - 5.
7. Ответственный за производство работ: +7-921-781-39-34, производитель работ АО «МегаМейд» Гайдичук В.В.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный
1	Подача заявки в ЦДС ГУП «ТЭК СПб». Получение подтверждения заявки.	T1 «02» 03.2021г. 8.00 T2 «26» 02.2021г. 8.00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
2	Отключение и слив трубопровода ТС.	T1 «02» 03.2021г. с 10.00 до 16.00 T2 «26» 02.2021г. с 10.00 до 16.00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Производство работ по присоединению тепловой сети к существующей на отключённом участке.	T1 «02» 03.2021г. с 16.00 до «03» 03.2021г. 21.00 T2 «26» 02.2021г. с 16.00 до «28» 02.2021г. 21.00	АО «МегаМейд»	Гайдичук В.В.
4	Запуск ТС до установленных на временной сети Ду 1000 мм шаровых кранов для обеспечения ЦО и ГВС отключённых потребителей.	T1 «02» 03.2021г. до 22.00 T2 «26» 02.2021г. до 22.00	АО «МегаМейд»	Гайдичук В.В.
5	Оповещение АДС РТС о завершении работ.	T1 «03» 03.2021г. с 21:00 до 21:10 T2 «28» 02.2021г. с 21:00 до 21:10	АО «МегаМейд»	Гайдичук В.В.
6	Заполнение трубопровода ТС.	T1 «03» 03.2021г. с 22:00 до 02:00 T2 «01» 03.2021г. с 9 :00 до 15:00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
7	Запуск ТС в постоянную работу. Оповещение ЦДС о завершении работ.	T1 «04» 03.2021г. с 02:00 до 02:30 T2 «01» 03.2021г. с 15:00 до 16.00	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Возможно снижение гидравлических параметров в зоне действия котельной «Парнас».

Производство работ по присоединению вновь построенной временной тепловой сети к существующей возможно только после получения положительных анализов СЭС.


Приложение: схема отключения магистральной тепловой сети.

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ АО «МегаМейд»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»



[Signature] / Прусевич В.С.


[Signature] / Селивёрстова Е.Н.

[Signature] / Гайдичук В.В.

[Signature] / Савинов А.Г.

примечание: разрешается при t° воздуха не ниже -5°С.

**Схема отключения магистральной тепловой сети, расположенной на объекте:
«Реконструкция тепловых сетей по пр. Энгельса от ТК-168 по пр. Просвещения к
ТК-2 у метро "Прспект Просвещения"».**

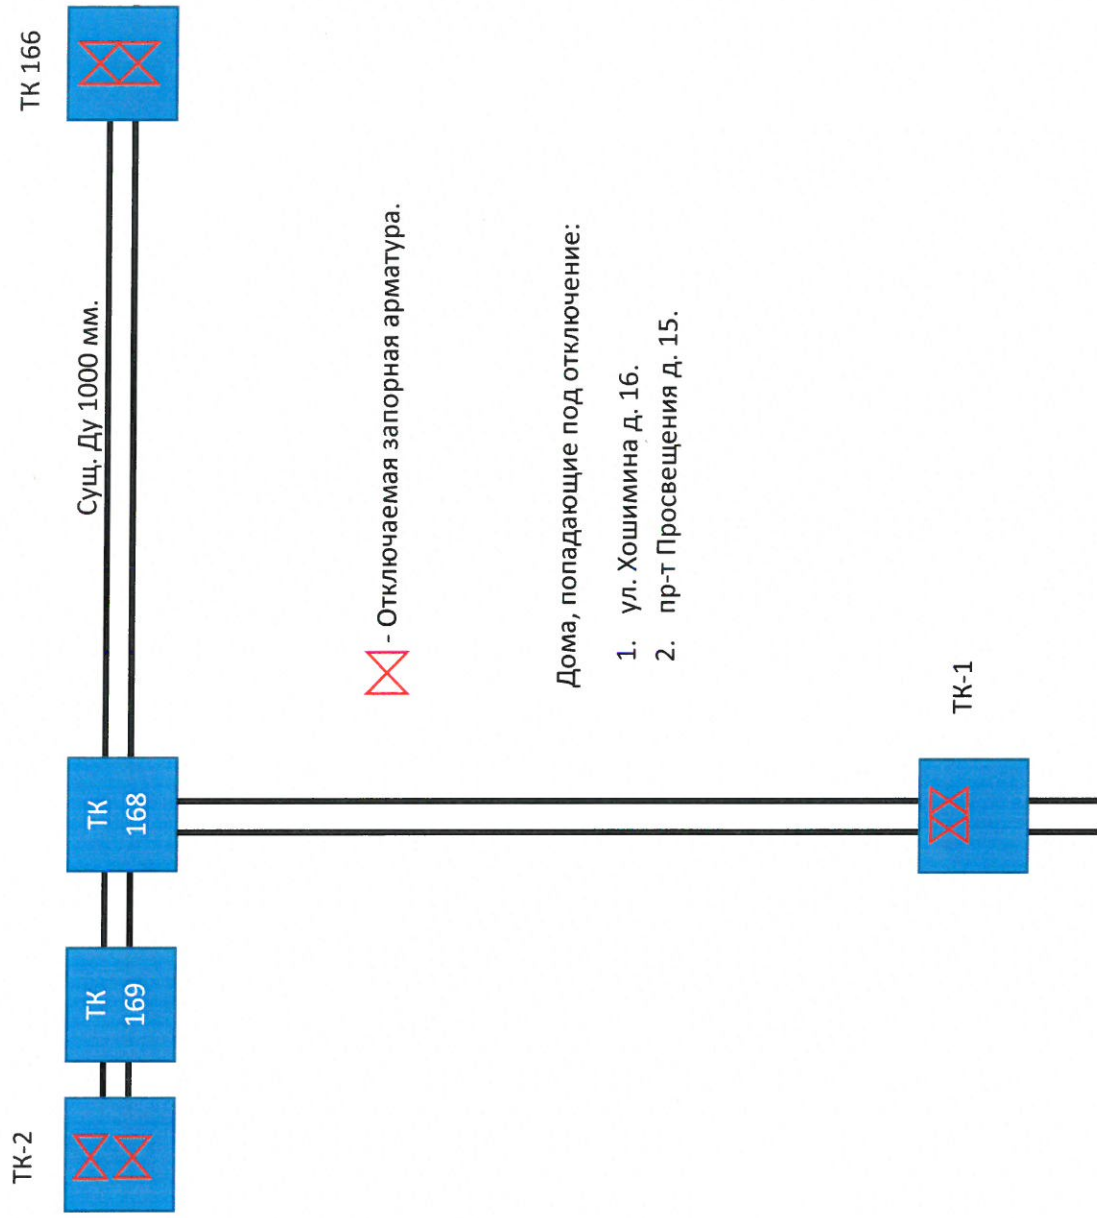

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Производитель работ АО «МегаМейд»

 / Прусевич В.С.

 / Гайдичук В.В.
