





Согласовано:
Зам.гл.инженера ФТС ГУП
"ТЭК СПб"



Согласовано:
ГУЖА



Согласовано:
Комитет по Энергетике

Согласовано:

Комитет по Энергетике

Производства работ по переключению временного трубопровода Ду 250мм, Ду76мм
на объекте: Реконструкция тепловых сетей в квартале 3 Черная Речка (Ограниченнной Школьной ул., Карельским пер., ул. Савушкина,
наб. Черной Речки)

Источник тепла:

Время производства работ: с 09.30 28.04 до 23.59 28.04

Дренирующая арматура расположена

Отключающая арматура находится: в ТК-1,

число 24.

Источник тепла 3

С отключением/Без отключения абонентов от ГВС.

Сварочных постов – 2; сварочных звеньев – 2

Количество стыков: Ду 250мм – 4 шт. Ду76 – 4 шт.

Ответственный за производство работ от ООО "СТИМ" – Сон Денис Аркадьевич. +7-(967)-599-66-66

Отключаемые абоненты: Школьная ул. д. 2,3,4,5,6; Наб. Черной речки д. 2,6,8,10,12; Карельский пер. д.3,5; ул. Савушкина д. 2,3,5,7,7/3,9; ул. Крылова д.4; Ушаковская наб. д.17/1

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечания
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	до 15ч 00мин	РТС ГУП "ТЭК СПб"	Руппель В.Э.	
2	Отключение обратного трубопровода и слия воды.	с 09ч 30мин до 12ч 30мин	РТС ГУП "ТЭК СПб"	Руппель В.Э.	
3	Производство работ переключению трубопровода стыков: Ду 250мм – 4 шт. Ду76 – 4 шт.	с 12ч 30мин до 21ч 30мин	ООО «СТИМ»	Сон Д.А.	

	<i>Министр</i>	
4	Заполнение обратного временного и постоянного трубопроводов	с 21ч 30мин до 23ч 30мин
5	Оповещение АДС ФТС, ЦДС о выполненной работе.	РГУП "ТЭК СПб" с 23ч 30мин

Начальник Северо-Западного РГС ФТС ГУП "ТЭК СПб"

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб"*

Начальник участка ООО «СТИМ»

Руппель В.Э.

Савинов А.Г.

Ландик А.Н.

Сон Д.А.






*При условии получения положительных результатов СЭС



Схема багажника верхний

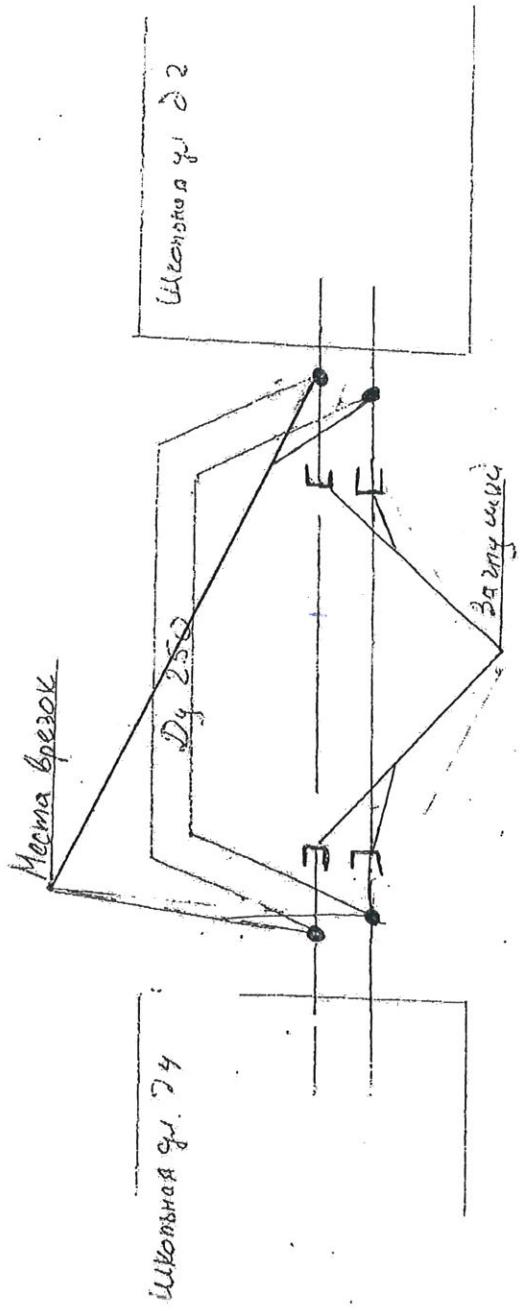

Excess oxygen generation in microtire cones

