


8111898


Утверждено:
Генеральный директор ООО «ГК
«Энергосистемы»


А.Ю. Кузуб
Согласовано:
Комитет по энергетике

Согласовано:
Зам. Гл. инженера
ФЭС ГУП «ТЭК СПБ»


Ф.А. Сайко

Согласовано:
Произведетвенное
управление ГУП «ТЭК СПБ»


Согласовано

Согласовано:
Гл. инженер
ФЭИ ГУП «ТЭК СПБ»


И.А. Калышов
Согласовано:
Администрация Приморского района

Производства работ по присоединению прямого участка трубопровода Ду250мм. вновь построенной тепловой сети в ТК-5(ТК-30АК7суш.)

объекта: Строительство тепловой сети от Орлово-Денисовского пр. до участка 1напротив дома 41, лит. А по Заповедной ул. для теплоснабжения строящегося

комплекса МИЦ им. В.А. Алмазова в Приморском районе СПб

Время производства работ: 27.04 2021г с 9:00 до 03:30 28.04.2021

отключающая арматура расположена: в ТК-5(ТК-30АК7суш.)

Количество абонентов, попадающих под отключение: всего - девятьдесят один (91) абонент (18корт 1, 18корт 2, 18корт 3, 19корт 4 (дежилье), 19корт 5 (вспомогат.)

Отключающая арматура находится: в Судовладельстве шесте 28корт 1, 26корт 2, 22корт 4, 24корт 3 (гидравл.)

Дренажирующая арматура расположена:

Дренажирующая арматура расположена:

С отключением ГВС и ЦО

Сварочных постов - 3; сварочных звеньев - 2

Количество стыков: Ду700мм. - 2 стыка, Ду250мм - 2 стыка

Ответственный представитель ООО «ГК «Энергосистемы»
Производитель работ. Андрей Александрович Гуляк 8 (921) 307-21-76

Начальник Северо-Западного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» Владимир Эдуардович Руппель 8 (901)307-02-80

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечания
1	Подача заявки в ЦДС ГУП "ТЭК СПб" с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с Получение подтверждения заявки.	21.04.2021г	СРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель	
2	Отключение существующего прямого трубопровода теплосети и слив воды.	27.04.2021г с 9-00 до 11-00	СРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель	
3	Производство работ по присоединению вновь построенного участка прямого трубопровода Ду250мм. к существующей тепловой сети Ду700мм.	27.04.2021г с 11-00 до 19-00	ООО "ГК "Энергосистемы"	А.А. Гуляк	
4	Оповещение АДС ЛРТС о завершении работ.	27.04.2021г с 23-00	ООО "ГК "Энергосистемы"	А.А. Гуляк	
5	Заполнение прямого и вновь построенного участка трубопровода Ду250 мм. при получении положительных анализов СЭС	27.04.2021г с 09-00 до 13-00	СРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель	
6	Постановка на циркуляцию вновь построенного участка теплосети (в присутствии представителя ООО «ГК«Энергосистемы») оповещение ЦДС о завершении работ	28.04.2021г с 13-00 до 13-00	СРТС ГУП "ТЭК СПб" ООО "ГК "Энергосистемы"	В.Э. Руппель А.А. Гуляк	

Начальник СРТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" _____

В. Э. Руппель

Начальник УСК ГУП "ТЭК СПб" _____

Л.В. Хилько

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб" _____

А.А. Халаим

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» _____

О.С. Белов

Начальник ДГ ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____

Д.И. Пудников

Ответственный за производство работ от ООО «ГК Энергосистемы» _____

А.А. Гуляк



Программа действует в течении 10 дней

Утверждено:
Генеральный директор ООО «ГК
«Энергосистемы»

А.Ю. Кузуб

Согласовано:
Комитет по энергетике

Согласовано:
Зам. Гл. инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»

С.А. Сайко

Согласовано:
ГУЖА Приморского района

Согласовано:
Производственное
Противление ГУП «ТЭК СПб»
СОГЛАСОВАНО

2021

Согласовано:
Гл. инженер
ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

И.А. Каляшов

Согласовано:
Администрация Приморского района

И.А. Каляшов
20.04.2021

И.А. Каляшов

ПРОГРАММА (РЭС) РЕМ

Производства работ по присоединению в сущ. т/сеть Ду700мм. обратного участка трубопровода Ду250мм. вновь построенной тепловой сети в ТК-5(ТК-30АК7сущ.) объекта: Строительство тепловой сети от Орлово-Денисовского пр. до участка И напротив дома 41, лит. А по Заповедной ул. для теплоснабжения строящегося комплекса МИЦ им. В.А. Алмазова в Приморском районе СПб

Время производства работ: 27.04. 2021г. 9⁰⁰ - 03³⁰ 28.04.2021

отключающая арматура расположена: _____ в ТК-5(ТК-30АК7сущ.)

Количество абонентов, подающих под отключение: Арматура - 18 корд 1, 18 корд 2, 19 корд 3, 19 корд 4 (штыль)

Отключающая арматура находится: _____ в ТК-5(ТК-30АК7сущ.) Судальское шоссе 28 корд 2, 26 корд 2, 22 корд 4, 24 корд 3 (штыль)

Дренирующая арматура расположена: _____ в ТК-5(ТК-30АК7сущ.)

Дренирующая арматура расположена: _____

С отключением ГВС и ЦО _____

Сварочных постов - 3 ; сварочных звеньев - 2

Количество стыков: Ду700мм. - 2стыка. Ду250мм - 2 стыка
Ответственный представитель ООО «ГК «Энергосистемы»
Производитель работ. Андрей Александрович Гуляк 8 (921) 307-21-76
Начальник Северо-Западного РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» Владимир Эдуардович Руппель 8 (901)307-02-80

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный	Примечания
1	Подача заявки в ЦДС ГУП "ТЭК СПб" с оповещением абонентов о работах на трубопроводе т/с Получение подтверждения заявки.	21.04.2021г	СРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель	
2	Отключение существующего обратного трубопровода теплосети и слив воды.	27.04.2021г с 9-00 до 11-00	СРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель	
3	Производство работ по присоединению вновь построенного участка обратного трубопровода Ду250мм. к существующей тепловой сети Ду700мм.	27.04.2021г с 11-00 до 23-00	ООО "ГК "Энергосистемы"	А.А. Гуляк	
4	Оповещение АДС ЛРТС о завершении работ.	27.04.2021г с 23-00	ООО "ГК "Энергосистемы"	А.А. Гуляк	
5	Заполнение обратного вновь построенного участка трубопровода Ду250 мм. при получении положительных анализов СЭС	27.04.2021г с 23-00 до 23-00	СРТС ГУП "ТЭК СПб"	В.Э. Руппель	
6	Постановка на циркуляцию вновь построенного участка теплосети (в присутствии представителя ООО «ГК«Энергосистемы») оповещение ЦДС о завершении работ	28.04.2021г 23-00 30	СРТС ГУП "ТЭК СПб" ООО "ГК "Энергосистемы"	В.Э. Руппель	А.А. Гуляк

Начальник СРТС ФТС ГУП "ТЭК СПб" _____ В. Э. Руппель

Начальник УСК ГУП "ТЭК СПб" _____ Л.В. Хилько

Ведущий инженер ОСК по ТС ГУП "ТЭК СПб" _____ А.А. Халаим

Начальник ДС ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» _____ О.С. Белов

Начальник ДГ ЛРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» _____ Л.И. Пудников

Ответственный за производство работ от ООО «ГК Энергосистемы» _____ А.А. Гуляк




Программа действует в течении 10 дней

СХЕМА подключения
участка вновь построенной теплосети Ду250мм.

в сущ.т/сеть Ду700мм. в ТК5(ТК-30АК7 сущ.)

объекта: Строительство тепловой сети от
Орлово-Денисовского пр. до участка 1
напротив дома 41, лит. А по
Заповедной ул. для теплоснабжения
строящегося комплекса МИЦ им. В.А.
Алмазова в Приморском районе СПб

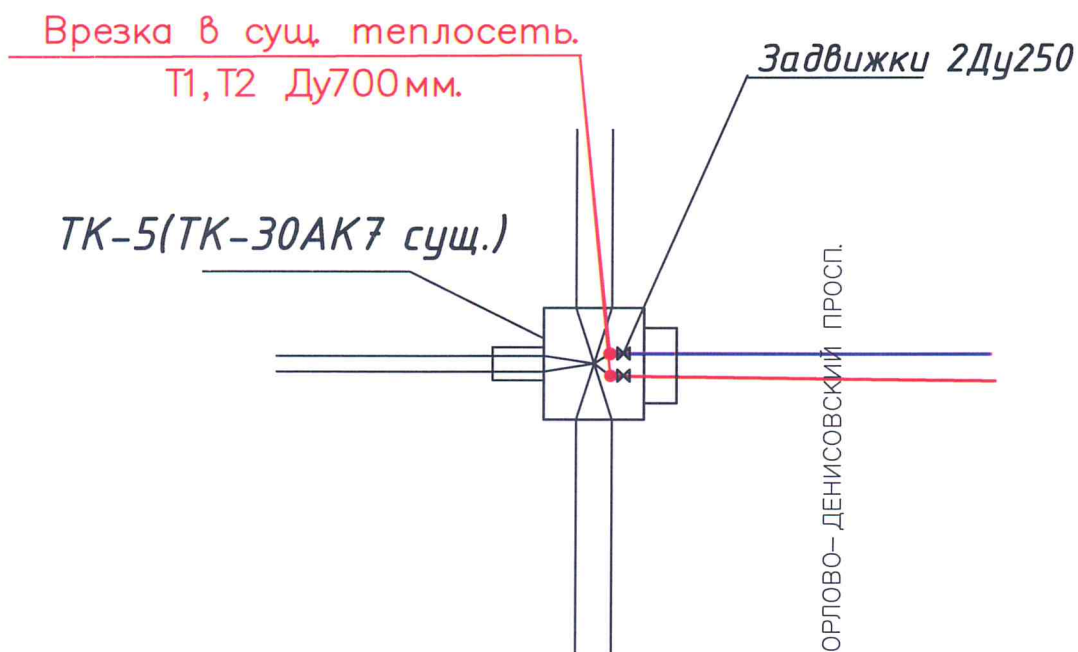

Согласовано:

Начальник Северо-Западного РТС ГУП "ТЭК СПб" _____ Руппель В.Э.

Ведущий инженер ОСК РСО ГУП "ТЭК СПб" _____ А.А.Халаим.

Начальник участка ООО "ГК" ЭнергоСистемы" _____ А.А.Гуляк.

