



СОГЛАСОВАНО  
Начальник участка  
ООО «РосСтройТрейдинг»




СОГЛАСОВАНО: Гарина  
Администрация района  
Алминдминистрация района  
ОТДЕЛ РАЙОННОГО ХОЗЯЙСТВА  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

СОГЛАСОВАНО:  
Зам. главного инженера  
ФГУП «ТЭК СПб»



СОГЛАСОВАНО:




СОГЛАСОВАНО:  
ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»



СОГЛАСОВАНО:  
Консульт. по энергетике и  
инженерному обеспечению

СОГЛАСОВАНО:  
ГУЖ район  
казенное учреждение государственного  
административно-управленческого  
характера «Управление  
районного жилищно-коммунального  
хозяйства и благоустройства  
Выборгского РКА



ЗАО «ТЭК СПб»  
ООО «ТЭК СПб»  
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода постоянной тепловой сети 2Ду150.

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 11 Шувагово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, ул. Холмикина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д. 12 к. 1, д. 12а; ТК-6 - ул-Холмикина, д.13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»

Участок: Асафьева 12к1 (1. часть) - Асафьева 12к1 (пр. часть).  
Время производства работ: 26/1/2020г. с 10.00 до 19.00 (9ч)

Дренажущая арматура расположена: ТК-7  
Отключенная арматура расположена: ТК-7  
Отключение потребителей от ПВС: Асафьева 10к1  
Отключение потребителей от ТЭС: с отключением ПУ.

Количество абонентов подающих под отключение: (2) ул. Асафьева 12к1, 12А.  
Количество сварных стыков: 4 шт.  
Количество сварочных постов: 2 шт.  
Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с соответствием с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС

Ответственный за переключение: Будян Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в АДЦ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	24.11.2020 г. до 8.30	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	24.11.2020 г. до 9.30	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Отключение подающего и обратного трубопровода	с 10.00 25.11.2020 г. до 11.00 26.11.2020 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
4	Производство работ по врезке подающего и обратного трубопровода	с 11.00 26.11.2020 г. до 17.30 26.11.2020 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
5	Оповещение АДЦ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ.	в 18.00 26.11.2020 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
6	Заполнение подающего и обратного трубопровода.	в 18.30 26.11.2020 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Данная программа действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализом отбора проб воды

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник АДЦ ФЭИ ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»

Прусевич В.С./

Белов О.С./

Савинов А.Г./


Селиверстова Е.Н./

Смирнов Д.К./

Будян Р.К./




# Схема врезки прямого и обратного трубопроводов временной тепловой сети на участке Асафьева 12к1 (л. крыло) – Асафьева 12к1 (пр. крыло)

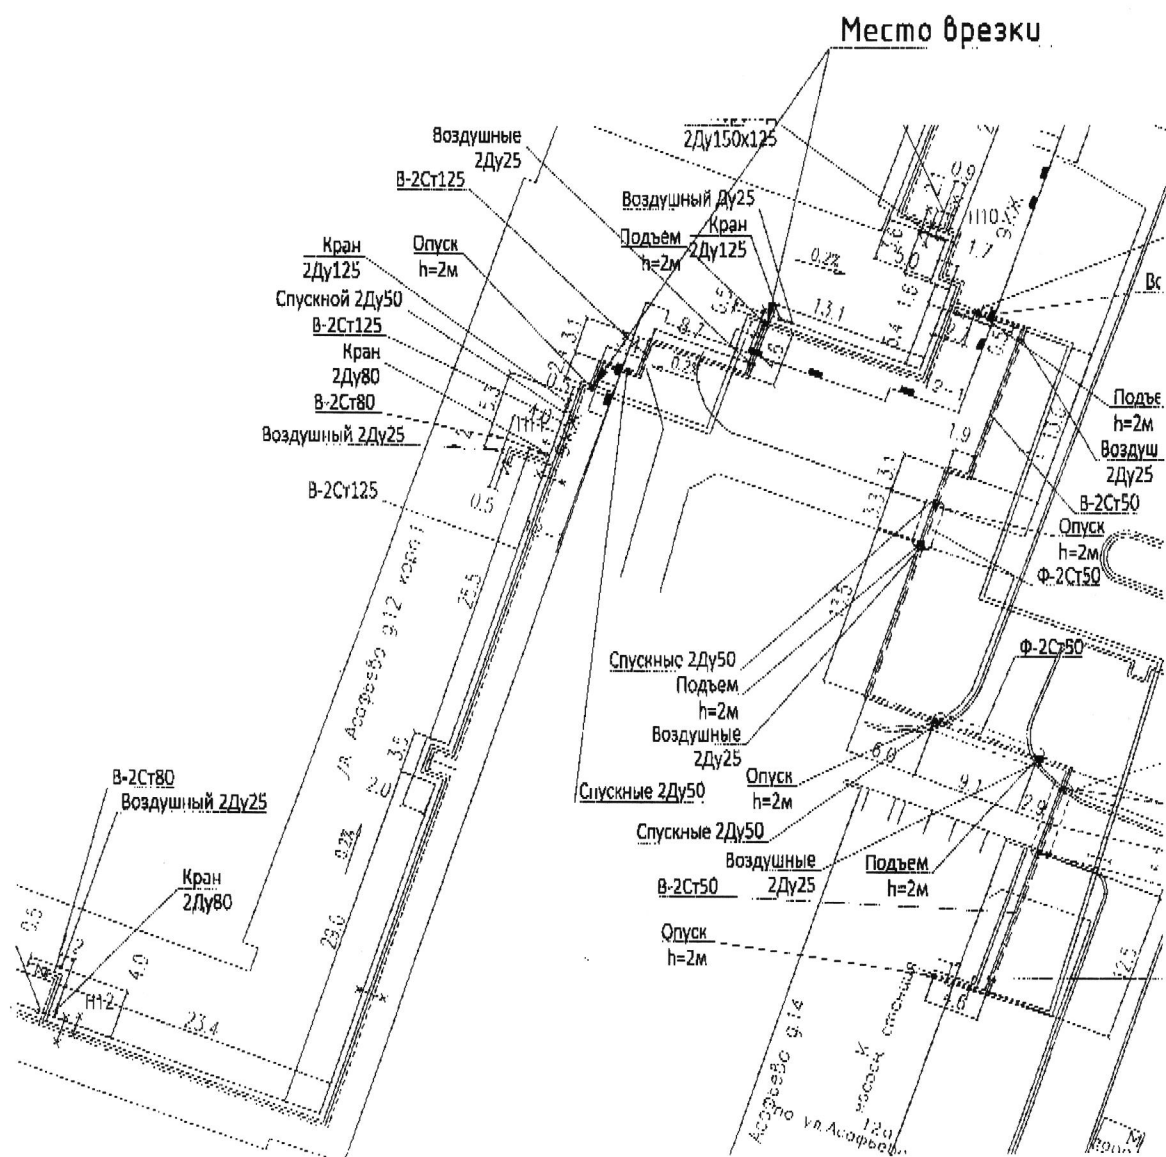

Начальник участка "ООО РосБелСтройТрейд" *[Signature]* Д.К.

Производитель работ "ООО РосБелСтройТрейд" *[Signature]* Р.К.



Формат А4
