

СОГЛАСОВАНО
Начальник участка
ООО "РосГЭС" (проектный отдел)

Смирнов Д.К.

СОГЛАСОВАНО
Зам. начальника проекта
ФУТУЦ и ГЭС

Федотов Александр Александрович
Инженер

СОГЛАСОВАНО
Г.У.Д.А. района

Смирнов Д.К.

СОГЛАСОВАНО
Администрация района

Смирнов Д.К.

СОГЛАСОВАНО
Зам. регионального директора
ООО "ЖКСМ" Выборгского района

Мельник А.П.

СОГЛАСОВАНО
Пр. Управляющего
Г.У.Д. Ж.С.С.В.А.НО

Безруков И.В.

СОГЛАСОВАНО

Комитет по энергетике в
подписанному обеспечению

26.04.2018

Программа Р(С)Б

Производства работ по прорезке подающего и обратного трубопровода постоянной температурой тепловой сети 2/0-2000 «Реконструкция тепловых сетей в квартале П Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп.1, 2, ул. Хошимина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д.12 к.1, д.12а; ТК-6 - ул. Хошимина, д.13 к.1,2,3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к.2, д.138 к.2.»

Участок: Асафьева 10к1 - Асафьева 12к1.
Время производства работ: 29.04.2018 г. с 10.00 до 21.00 (11ч)

Дренажная арматура расположена: Асафьева 12к1.

Отключающая арматура расположена: Асафьева 10к1.

Отключение потребителей от ГВС: с отключением ГВС.

Отключение потребителей от ТС: с отключением ЦО.

Количество абонентов попадающих под отключение: (2) Асафьева 14, Асафьева 12к1.

Количество сварных стыков: 8 шт.

Количество сварочных постов: 3 шт. (1 в резерве)

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом: Шифр: 07/17-2811-1С


Ответственный за переключение: Будан Р.С. (8-921-793-36-05), Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник участка

ООО «РосБелСтройТрейд»

Смирнов Д.К.




СОГЛАСОВАНО:

Зам. генерального директора

ООО «ЖКС-Мет Выборгского района»

Мельник А.П.



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера

ФУП «УК «СЖСШ»»

Филиал тепловых сетей
192007, Санкт-Петербург, ул.
Днепропетровская ул., д. 69

СОГЛАСОВАНО:

Производственное управление
ГБУ «ТЭК СПб»

« 16 » 20 11 г.

СОГЛАСОВАНО:

ГУЖА района

Администрация Выборгского района
Выборгское РУКА

СОГЛАСОВАНО:

Администрация района

Администрация района
Выборгского района
Текст - Петербург

ОТДЕЛ РАЙОННОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

ТЕЛ 576-52-47

СОГЛАСОВАНО:

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению

Программа Р(С)Б

Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода постоянной тепловой сети 2Ду 200.

«Реконструкция тепловых сетей в квартале 11 Шувалово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, ул. Хошимина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.10 корп.1, д. 12а; ТК-6 - ул-Хошимина, д13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»

Участок: Асафьева 10к1 – Асафьева 12к1.

Время производства работ: 29.04.2021г. с 10.00 до 21.00 (11ч)

Дренарующая арматура расположена: Асафьева 12к1.

Отключающая арматура расположена: Асафьева 10к1.

Отключение потребителей от ГВС: с отключением ГВС.

Отключение потребителей от ТС: с отключением ЦО.

Количество абонентов подающих под отключение: (2) Асафьева 14, Асафьева 12к1.

Количество сварных стыков: 8 шт.

Количество сварочных постов: 3 шт. (1 в резерве)

Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС

Ответственный за переклечение: Будян Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	26.04.2021 г. до 8.30	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
2	Отключение подающего и обратного трубопровода	с 10.00 29.04.2021 г. до 11.00 29.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
3	Производство работ по врезке подающего и обратного трубопровода	с 11.00 29.04.2021 г. до 19.30 29.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
4	Оповещение АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ.	в 20.00 29.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
5	Заполнение подающего и обратного трубопровода.	в 20.30 29.04.2021 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Данная программа действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализов отбора проб воды, при t° воздуха не ниже -5°С

РЭД «ТЭК СПб»
Федеральный центр тепловых сетей

Для документов
Северный район тепловых сетей

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»

/Прусевич В.С./


/Савинов А.Г./

/Селиверстова Е.Н./

/Смирнов Д.К./

/ Будян Р.К./


Схема врезки прямого и обратного трубопроводов тепловой сети на участке Асафьева 10к1 – Асафьева 12к1

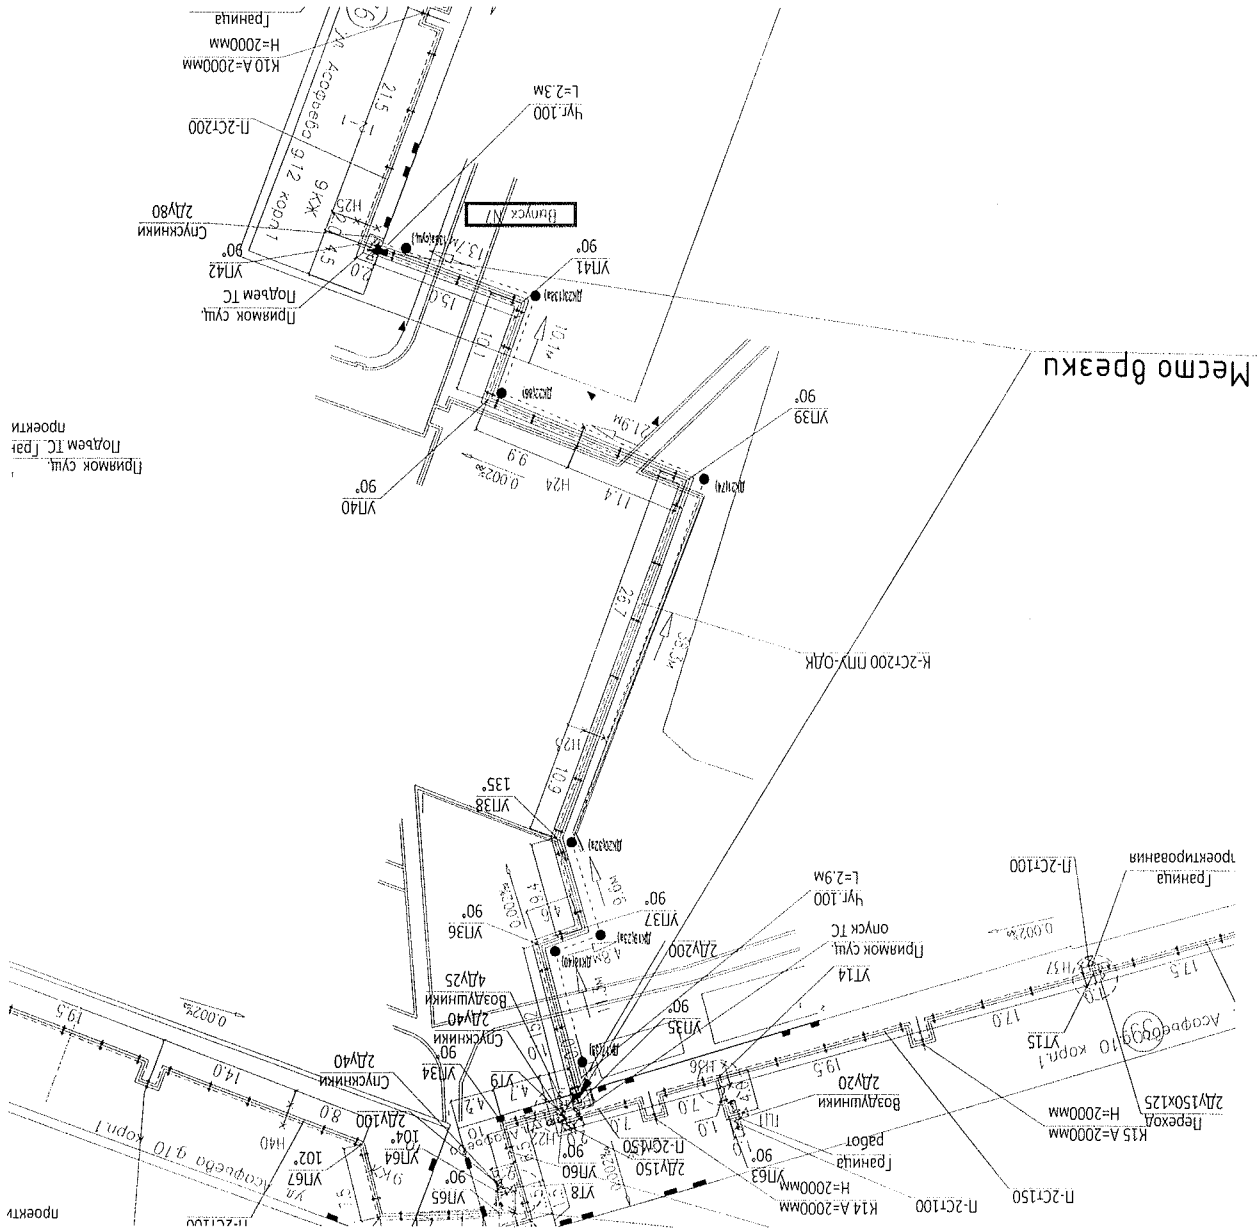

Прямая ТС, раб
проекти

проекти

Место врезки



Начальник участка "ООО Росбелстрой" Д.К.
 Руководитель работ "ООО Росбелстрой" В.К.
 Проект: П.К.
