





СОГЛАСОВАНО:
Начальник участка
ООО «РосБелСтройТрейд»

Смирнов Д.К./


СОГЛАСОВАНО:
Зам. генерального директора
ООО «ЖКС №1 Выборгского района»

/ Мельник А.П./

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главного инженера
ФТС ГУП «ТЭК СПб»
ГУП «ТЭК СПб»
192007, Санкт-Петербург,
Андропольская ул., д. 69


СОГЛАСОВАНО:
Администрация района
Выборгского района
Санкт-Петербурга
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕЛ 578-52-47


СОГЛАСОВАНО:
Производительное управление
ФГУП «ТЭК СПб»
СОГЛАСОВАНО


СОГЛАСОВАНО:
Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению


Программа Р(С)Б

Производства работ по врезке подающего и обратного трубопровода временной тепловой сети 2Ду 50.
«Реконструкция тепловых сетей в квартале 11 Шуваглово-Озерки: ТК-2 - ул. Асафьева, д.2 корп.1,2, д.4 корп. 1, 2, ул. Хошимина, д.7 корп. 2, 3; ТК-4 - ул. Асафьева, д.6 корп. 1; ТК-7 - ул. Асафьева, д.16 корп.1, д. 12 к. 1, д. 12а; ТК-6 - ул-Хошимина, д13 к. 1, 2, 3; ТК-7а - ЦТП пр. Энгельса, д.134 к. 2, д.138 к. 2.»
Участок: Асафьева 12к1 – Асафьева 14.
Время производства работ: 19.04.2021г. с 10.00 до 21.00 (11ч)
Дренажирующая арматура расположена: Асафьева 14.
Отключающая арматура расположена: Асафьева 12к1 (правая часть).
Отключение потребителей от ГВС: с отключением ГВС.
Отключение потребителей от ТС: с отключением ЦО.
Количество абонентов подающих под отключение: (1) Асафьева 14.
Количество сварных стыков: 12 шт.
Количество сварочных постов: 3 шт. (1 в резерве)
Врезка трубопровода осуществляется в соответствии с согласованным проектом Шифр: 07/17-2811-ТС
Ответственный за переключение: Будян Р.К. (8-921-793-36-05); Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66).

№ п/п	Наименование работ	Дата и время работ	Производитель работ	Ответственный исполнитель
1	Подача заявки в АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	15.04.2021 г. до 8.30	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
2	Отключение подающего и обратного трубопровода	с 10.00 19.04.2021 г. до 11.00 19.04.2021 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.
3	Производство работ по врезке подающего и обратного трубопровода	с 11.00 19.04.2021 г. до 19.30 19.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
4	Оповещение АДГ ФТС ГУП «ТЭК СПб», ЦДУ ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ.	в 20.00 19.04.2021 г.	ООО «РосБелСтройТрейд»	Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд» Смирнов Д.К. (8-921-638-61-66) Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд» Будян Р.К. (8-921-793-36-05)
5	Заполнение подающего и обратного трубопровода.	в 20.30 19.04.2021 г.	Северный РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	Прусевич В.С.

Данная протрамма действует в течение одного месяца с момента подписания при положительном результате анализе отбора проб воды, при t° воздуха не ниже -5°С

Начальник РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»

/Прусевич В.С./

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб»

/Савинов А.Г./

Ведущий инженер УСК ОСК по ТС ГУП «ТЭК СПб»

/Селиверстова Е.Н./

Начальник участка ООО «РосБелСтройТрейд»

/Смирнов Д.К./

Производитель работ ООО «РосБелСтройТрейд»

/Будян Р.К./





Схема врезки прямого и обратного трубопроводов временной тепловой сети на участке от Асафьева 12к1 до Асафьева 14к1



Начальник участка "ООО РосБелСтройТрейд"

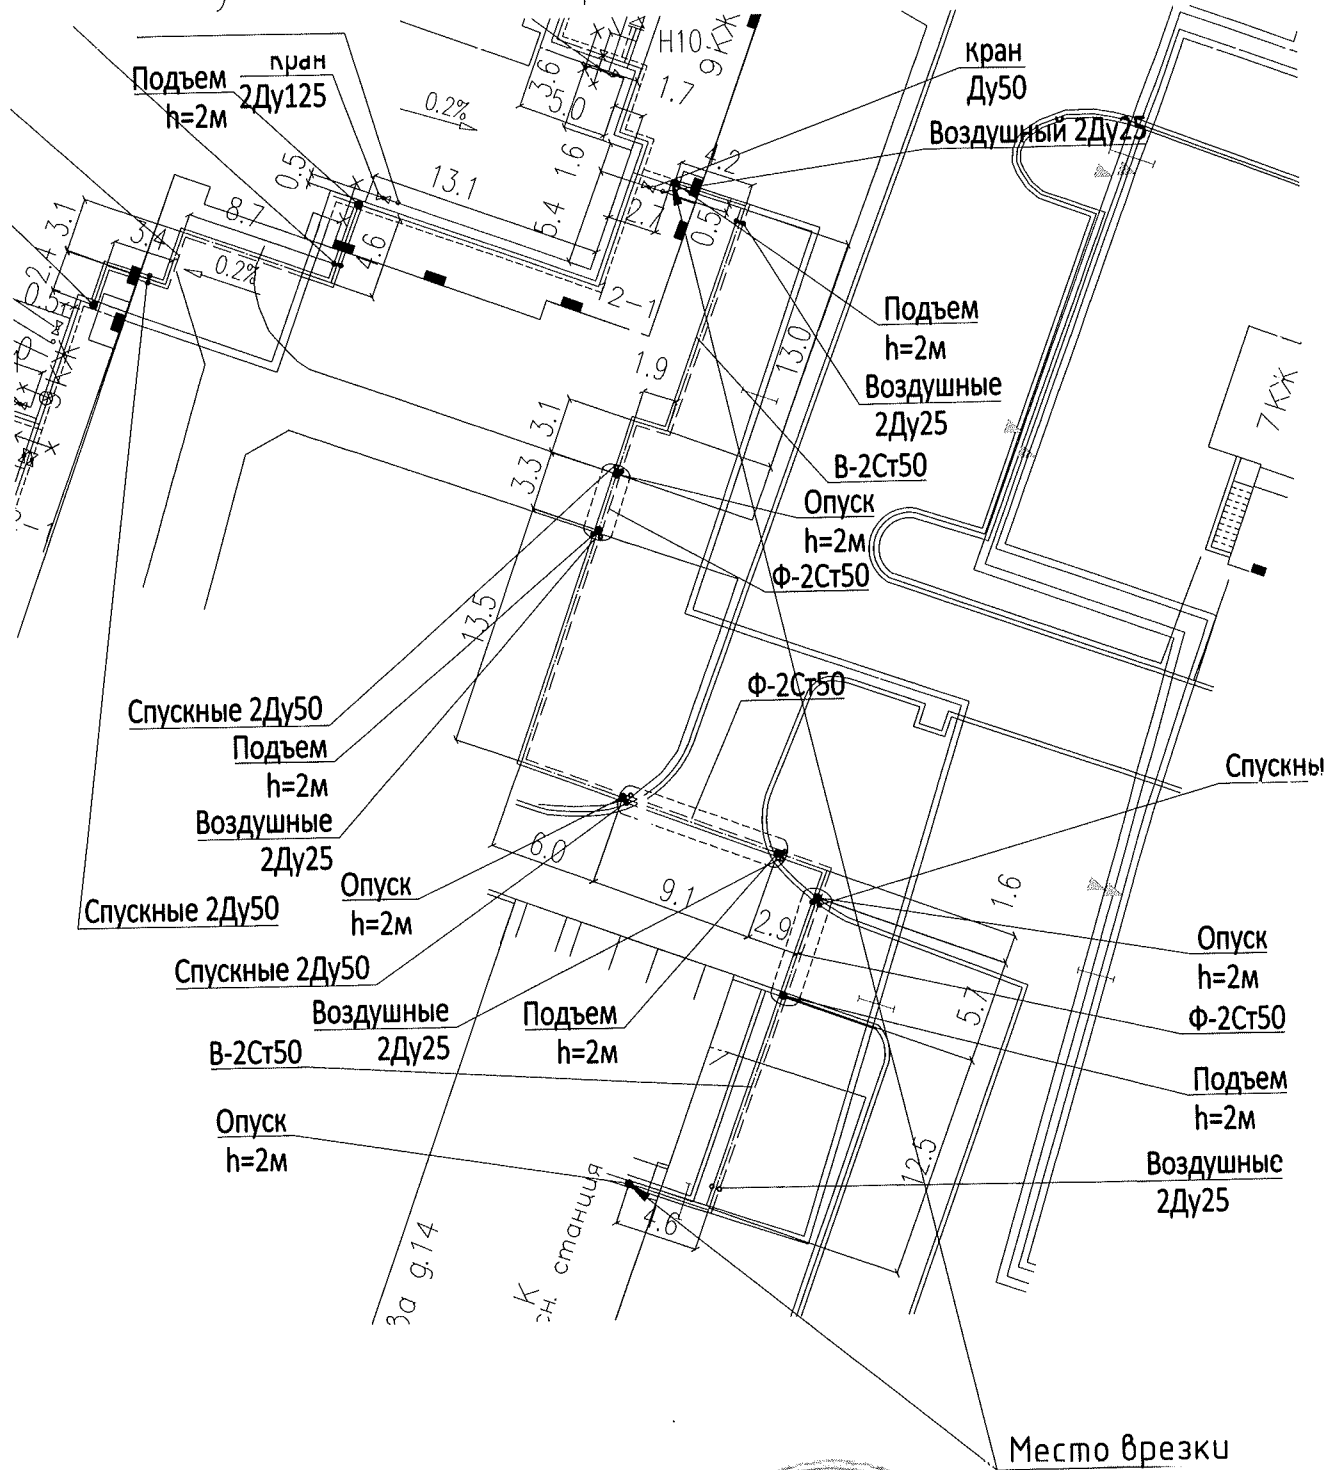

Смирнов Д.К.

Производитель работ "ООО РосБелСтройТрейд"

Будян Р.К.
