

Согласовано:  
Гл. инженер  
ООО «Инженерная Компания»  
И. Г. Федоров



Согласовано:  
Зам. Главного инженера  
Филиала Тепловых сетей  
ГУП «ТЭК СПб» «ТЭК СПб»  
Филиал БФ «Водоканал»  
192007, Санкт-Петербург,  
Андрополюстровская ул., 9. 69

Согласовано:  
ГУЖА Водоканал  
района Санкт-Петербурга

Согласовано: Начальник  
диспетчерской службы Комитета  
Энергетики  
09.04.2021



Согласовано:  
Начальник БУ «ЭКОНОМ» «ТЭ  
Производственное управление  
СОГЛАСОВАНО  
09 04 2021

Производство работ по врезке Временного и постоянного Прямого и Обратного трубопровода на объекте:

Реконструкция тепловых сетей в пос. Шушары, от УТ-3 на углу Первомайской ул. к домам: Школьная ул., д.

д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34.

Источник теплоснабжения:

Время производства работ: с 10:00 19.04.2021 до 24:00 19.04.2021

Дренарующая арматура расположена: *ГРБ*

Отключающая арматура расположена: *ГРБ*

С отключением потребителей, с отключением потребителей от ЦО и ГВС, без отключением потребителей от ЦО и ГВС (нужное подчеркнуть) *10*

Количество абонентов попадающих под отключение ЦО и ГВС *шестнадцать ул. Д. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 32*

Количество стыков, заглушек: *8* стыков Ду200, *12* стыков Ду100, *8* стыков Ду80, *8* стыков Ду125

Количество сварочных постов: *8* постов.

1	Подача заявки в АДС РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	До 14:00 10.03.2021	ООО «Инженерная Компания»	П.П. Бабяк (8-981-770-91- 47)
---	---	------------------------	------------------------------	-------------------------------------

2	Подача заявки в ЦДУ ГУП «ТЭК СПб»	До 14:00 10.03.2021	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
3	Отключение и опорожнение существующего обратного и прямого трубопровода	С 10:00 до 11:00 19.04.2021	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	
4	Производство работ по врезке вновь построенной тепловой сети Стыжки: 3 бшт. Сварочные посты: 8 шт.	С 11:00 19.04.2021 До 22:00 19.04.2021	ООО «Инженерная Компания»	<u>П.П. Бабяк</u>
5	Оповещение АДГ РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» о завершении работ	С 22:00 до 23:00 19.04.2021	ООО «Инженерная Компания»	<u>П.П. Бабяк (8-981-770-91-47)</u>
6	Заполнение прямого трубопровода	С 23:00 до 00:00 19.04.2021	РТС ФТС ГУП «ТЭК СПб»	

Работы производить при температуре не ниже -5° С.  
Программа действительна в течение 10 дней.

Начальник ПРТС ФТС ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_

В.В. Золотухин

Начальник АДГ ФЭИ ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_

О.С. Белов.

Начальник УСК ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_

А.Г. Савинов


Ведущий инженер ОСК по ТС УСК ГУП «ТЭК СПб» \_\_\_\_\_

А.А. Горбунов (При положительном анализе СЭС)


Прораб ООО «Инженерная Компания» \_\_\_\_\_

П.П. Бабяк (8-981-770-91-47)



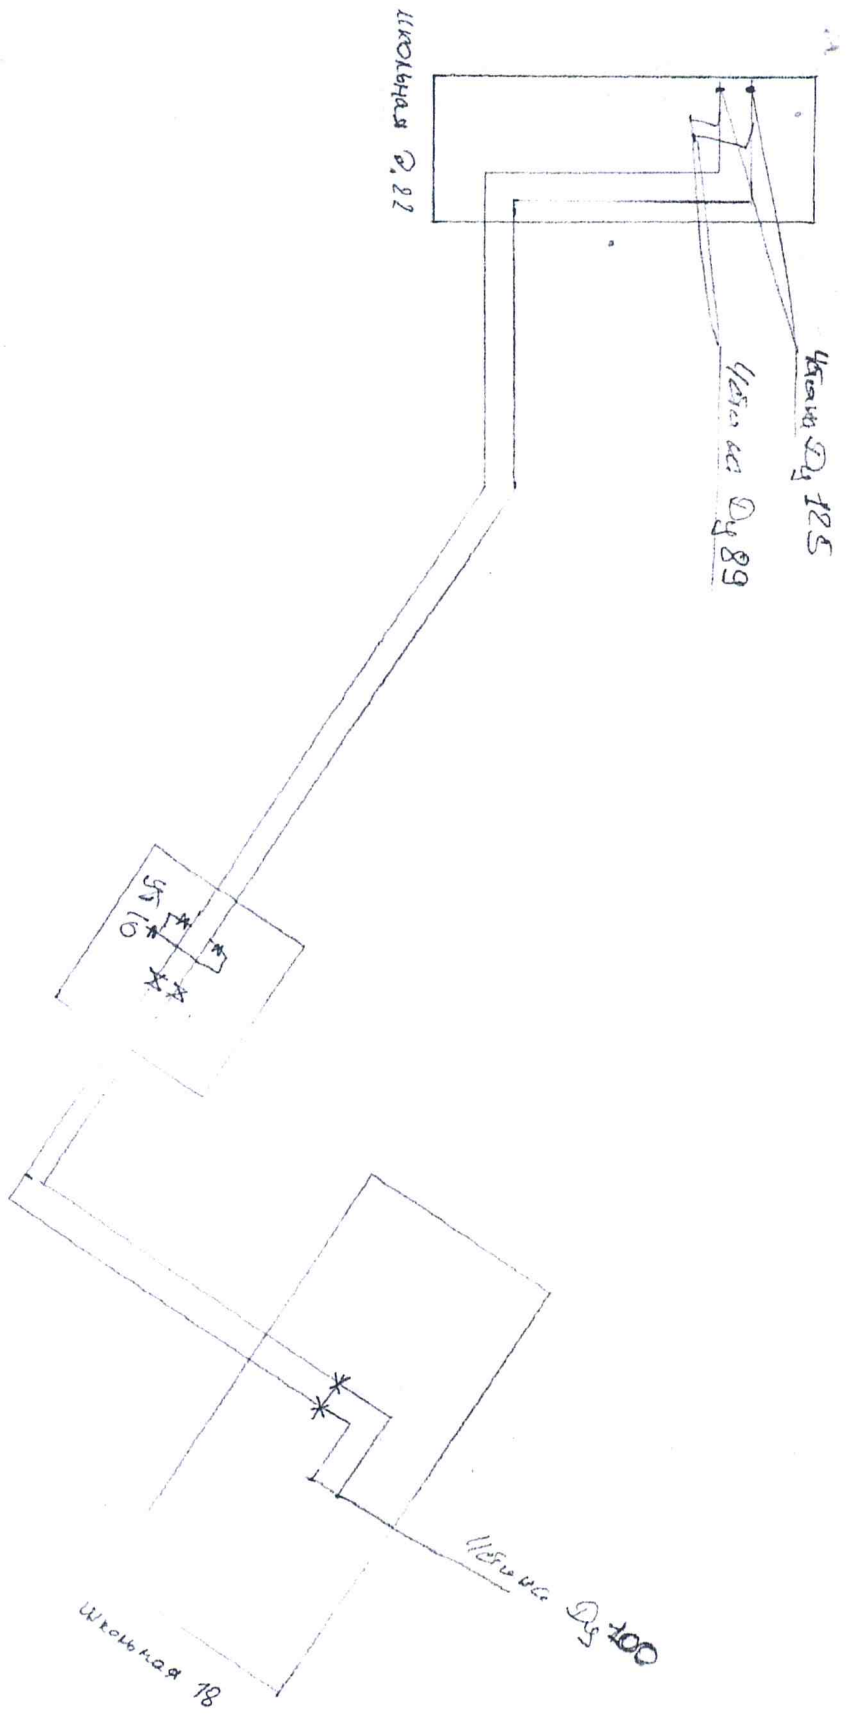

Представитель заказчика:  
 Представитель проекта: *А.Ф.*  
 Представитель подрядной организации:

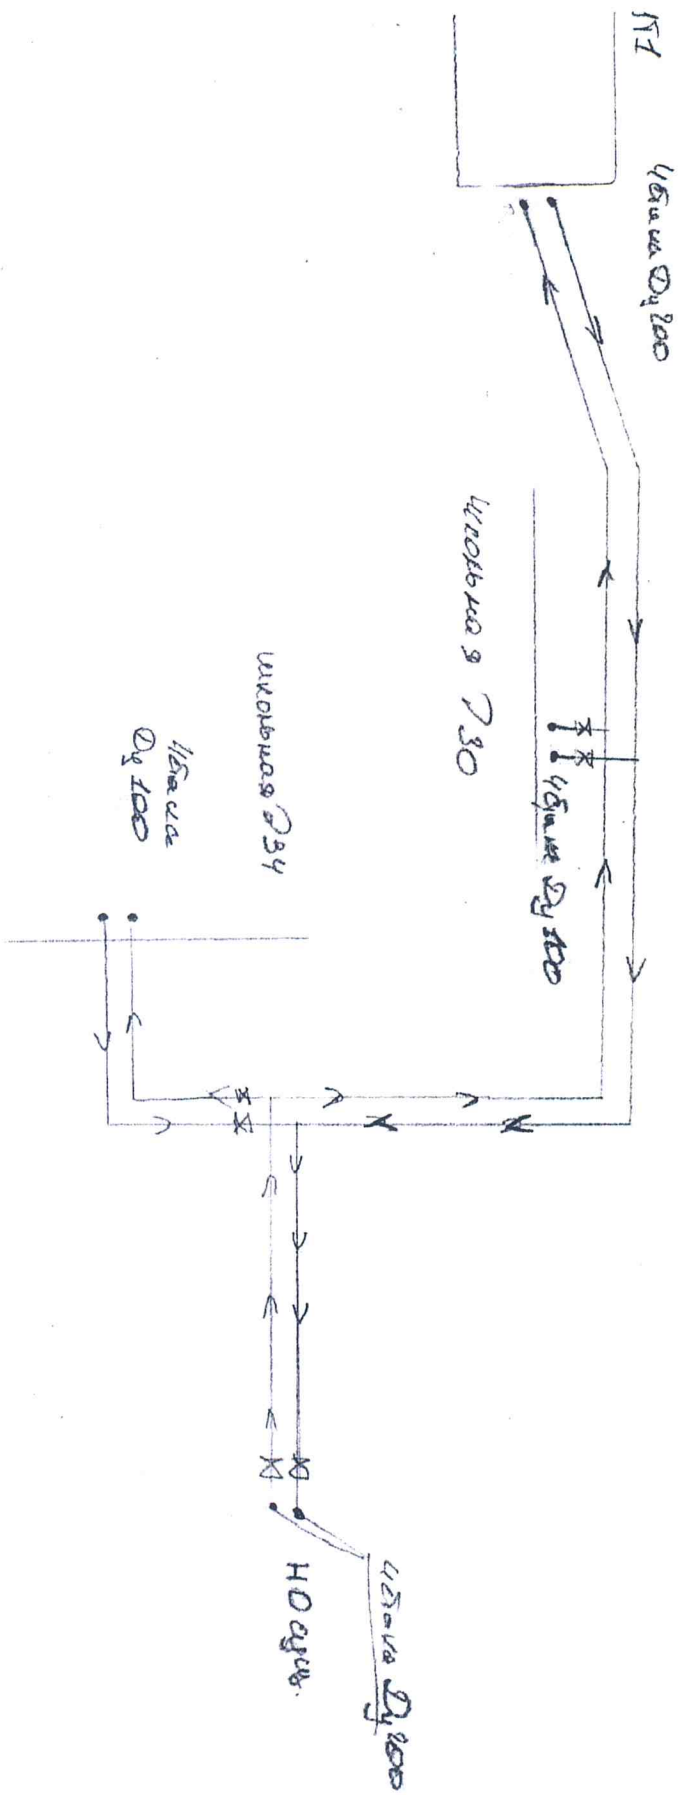

Проектная схема:  
 Проектная схема ТЭ: *А.А.*  
 Проектная схема:
